



**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR DI  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
CONTROLLO SULLA GESTIONE  
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)**

**DELIBERAZIONE 22 gennaio 2024, n. 21/2024 /GEST**



CORTE DEI CONTI

**MAGISTRATO RELATORE: VITTORIA CERASI**

**Hanno collaborato**

Francesca Perreca

Michela Ricciardi



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| dott. Antonio Buccarelli   | Presidente             |
| dott. Mauro Bonaretti      | Consigliere            |
| dott.ssa Rossana De Corato | Consigliere            |
| dott.ssa Vittoria Cerasi   | Consigliere (relatore) |
| dott.ssa Maura Carta       | Consigliere            |
| dott.ssa Rita Gasparo      | Referendario           |
| dott. Francesco Liguori    | Referendario           |
| dott.ssa Adriana Caroselli | Referendario           |
| dott. Francesco Testi      | Referendario           |

nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF -Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione SRCLOM n. 248/2022/GEST sulla ricognizione dei progetti del PNRR e PNC della Città Metropolitana di Milano;

VISTA la deliberazione SRCLOM/40/2023/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione SRCLOM/173/2023/INPR di rimodulazione dell'attività di controllo programmata per il 2023;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/2023/FRG del 27/10/2023 "Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite SSRRCO/34/2023/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2023, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTO il riscontro del 27 marzo 2023, Prot. Cdc n. 4301, con cui Città metropolitana di Milano ha risposto alla prima nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 8 marzo 2023, Prot. n. 3229, sullo stato di attuazione del PNRR;

VISTO il riscontro del 14 novembre 2023, Prot. Cdc n. 24704, con cui Città metropolitana di Milano ha risposto alla seconda nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 24 ottobre 2023, Prot. Cdc n. 23712, sull'aggiornamento circa l'attuazione del PNRR;

VISTA la disposizione n.7 del 9 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi

### **DELIBERA**

**di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione avente ad oggetto “Attuazione del PNRR di Città metropolitana di Milano, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”.**

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco Metropolitano e al Presidente del Consiglio metropolitano, nonché all'organo di revisione della Città Metropolitana.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Relatore  
(dott.ssa Vittoria Cerasi)

Il Presidente  
(dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il  
22 gennaio 2024

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)

## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Inquadramento normativo .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2. Stato di attuazione degli interventi .....</b>   | <b>9</b>  |
| 2.1 Avanzamento procedurale.....   | 13        |
| 2.2 Avanzamento finanziario .....  | 17        |
| 2.3 Effetti della rimodulazione.....   | 20        |
| <b>3. Progetti con soggetti attuatori esterni .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>4. Sistema di monitoraggio di città metropolitana .....</b>                                 | <b>27</b> |
| 4.1 La governance del PNRR .....   | 27        |
| 4.2 Sistema informatico di controllo.....  | 28        |
| <b>5. Situazione del personale.....</b>  | <b>30</b> |
| 5.1 Esperti della Regione .....  | 30        |
| 5.2 Assunzioni di personale a tempo determinato.....   | 31        |
| <b>6. Valutazioni conclusive.....</b>  | <b>34</b> |
| <br>   |           |
| Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia .....                   | 10        |
| Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC .....                              | 11        |
| Tabella 3 - Avanzamento procedurale.....   | 15        |
| Tabella 4 - Risorse accertate in bilancio, anticipazioni e pagamenti .....                     | 18        |
| Tabella 5 - Progetti oggetto di possibile definanziamento .....                                | 21        |
| Tabella 6 - Progetti di cui Città metropolitana non è soggetto attuatore.....                  | 24        |
| Tabella 7 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti del PNRR e PNC – Città metropolitana ..... | 38        |
| Tabella 8 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione .....              | 49        |
| <br>   |           |
| Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC.....                             | 12        |
| Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase).....                           | 14        |
| Grafico 3 – Stato di avanzamento finanziario (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)..      | 19        |
| Grafico 4 – Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento.....       | 22        |

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Sezione regionale di controllo della Lombardia, in continuità con l'attività di ricognizione svolta nel corso del 2022 sui progetti del PNRR e PNC di cui la Città Metropolitana di Milano è soggetto attuatore e tenendo conto delle novità intervenute nel contesto normativo, svolge il controllo sulla gestione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994 e dell'art. 7 del d.l. n. 77/2021. In proposito occorre premettere che, dopo l'entrata in vigore dall'art. 1, comma 12 quinquies, lett. b), del d. l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74, che, a modifica dell'art. 22 del d. l. n. 76/2020 sul controllo concomitante, ha escluso dallo stesso controllo i piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, la Sezione con la delibera n. 173/2023/INPR (adottata il 14 settembre 2023) ha modificato la delibera di programmazione n. 40/2023/INPR (adottata l'8 febbraio 2023), stabilendo che, con riferimento ai progetti che avevano formato oggetto di ricognizione nel 2022 (vedi delib. 248/2022/GEST) la Sezione avrebbe effettuato il "controllo sulla gestione" ai sensi dall'art. 7, comma 7, del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

In proposito con la suddetta deliberazione la Sezione ha richiamato le considerazioni svolte in materia di PNRR dalla Sezione delle Autonomie *"la quale, nel ritenere che "i controlli sulla gestione non possono attendere l'esito conclusivo delle attività, che, nella maggior parte dei casi, è molto protratto nel tempo" si è espressa nel senso che detti controlli devono "focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR)".* In siffatto assetto normativo e giurisprudenziale la valutazione gestionale della Corte, a fronte di interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a completamento entro il 2026, investe il raggiungimento dei risultati intermedi e la progressione dei relativi procedimenti amministrativi da parte dei soggetti attuatori. In particolare, il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del d.l. n. 77/2021 e dall'art. 3 della l. n. 20/1994, viene svolto *"anche in corso di esercizio"*, effettuando *"valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego"* delle relative risorse, verificando *"la legittimità e la regolarità"* dell'utilizzo delle risorse stesse e accertando *"la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge"*.

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione riguardante il *"Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77"* (II semestre 2023) si è soffermata sulle finalità del controllo sulla gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che *"Nella legislazione dedicata al PNRR e in particolare, all'art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi*

*titolari dei progetti finanziati per l'attuazione del programma Next Generation EU «conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali». Inoltre, il Documento della Commissione Europea "Commission Staff Working Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans" (SWD-2020 205 final) fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione "sound financial management", il concetto di "sana gestione finanziaria", che ricade nel perimetro di controllo che la Corte dei conti è chiamata a garantire. L'esigenza di un'oculata programmazione e gestione della spesa è fondamentale nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria dell'ente." (deliberazione n n.16/2023/FRG)*

Nel contesto normativo e giurisprudenziale richiamato si inserisce la presente deliberazione riguardante il controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria e procedurale, degli interventi di cui la Città Metropolitana di Milano è soggetto attuatore e/o beneficiario così come individuati con delibera n. 248/2022/GEST da questa stessa Sezione regionale di controllo.

## 2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Sezione, in continuità con la suddetta deliberazione n. 248/2022/GEST, ha avviato attività istruttoria nel mese di marzo 2023, integrata ad ottobre 2023 con nota istruttoria per recepire gli aggiornamenti, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) che vedono Città metropolitana di Milano in qualità di “soggetto attuatore”.

Sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente da Città metropolitana in qualità di “soggetto attuatore”, ovvero gli interventi con una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio di Città metropolitana, quale ente direttamente beneficiario dei finanziamenti stanziati dal PNRR (di natura esclusivamente europea dal dispositivo RRF o dei fondi del PNC) e la cui gestione è sotto il diretto controllo dell’Ente o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici).<sup>1</sup>

Gli enti locali sono soggetti attuatori qualora provvedano direttamente alla realizzazione degli interventi, oppure soggetti beneficiari quando si avvalgono di enti strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l’esecuzione del progetto. Il d.l. n. 77/2021 con l’art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino materialmente gli interventi, tra cui società partecipate *in-house* qualificate ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti. In questo caso l’amministrazione è tenuta a stipulare una convenzione con l’ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la responsabilità e la remunerazione.<sup>2</sup>

Sono esclusi dalla presente analisi gli interventi che, pur avendo una ricaduta sul territorio della CMM, esulano dal perimetro di bilancio dell’Ente.

La Sezione ha verificato lo stato di avanzamento sull’insieme degli interventi di cui Città metropolitana è soggetto attuatore sulla base degli esiti dell’attività istruttoria e avvalendosi degli elementi conoscitivi di cui alla piattaforma ReGiS<sup>3</sup>, nonché degli

---

<sup>1</sup> L’art.9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (in breve d.l. n.77/2021) stabilisce che “*alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.*”

<sup>2</sup> Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione o dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell’ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di garantire l’attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione.

<sup>3</sup> Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che “*I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del*

schemi compilati dal revisore dei conti dell'Ente. Nei questionari relativi al bilancio preventivo, infatti, si chiedeva ai revisori dei conti degli enti locali di validare lo schema predisposto dalla Sezione delle Autonomie circa lo stato di attuazione dei singoli progetti del PNRR e PNC al 30 giugno 2023.<sup>4</sup>

Gli interventi di cui Città metropolitana è soggetto attuatore sono rappresentati nella seguente tabella, aggregati per Missione.

**Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia**

|   | n. CUP     | Lump Sum | non nativi PNRR |
|---|------------|----------|-----------------|
| M1 - Digitalizzazione della PA                                      | 1          | 0        | 0               |
| M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio                   | 1          | 0        | 0               |
| M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido | 35         | 0        | 33              |
| M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità           | 117        | 0        | 16              |
|   | <b>154</b> | <b>0</b> | <b>49</b>       |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

L'Ente risulta soggetto attuatore/beneficiario di 154 progetti identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP): tra questi, 49 progetti sono della tipologia progetti "non nativi PNRR", la cui origine precede il PNRR ma che sono stati poi inseriti tra i progetti finanziabili dal PNRR<sup>5</sup>, di cui 35 nella Missione 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido) e 16 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità). Nessuno dei progetti appartiene alla tipologia Lump-Sum<sup>6</sup>. Nella Missione 5 si concentra il numero maggiore di progetti, pari al 76 per cento dei CUP (117 di 154 totali).

sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza." Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

<sup>4</sup> La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2023-2025 (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR) ha richiesto ai revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella precompilata con i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei singoli CUP. I revisori hanno dovuto trasmettere la "Tabella PNRR" non oltre il termine del 31 luglio 2023 (con eccezionale proroga per alcune particolari casistiche). E' bene chiarire che i risultati relativi a questo adempimento da parte dei revisori, sono quelli raggiunti al 30 giugno 2023.

<sup>5</sup> Proprio perché questi progetti non sono nati nell'ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione possano soddisfare i vincoli posti dal piano quale per esempio i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con l'acronimo DNSH (*Do Not Significant Harm*), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia ambientale.

<sup>6</sup> Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un'unica soluzione a

Nella tabella che segue si rappresentano le fonti del finanziamento, considerando l'insieme dei progetti aggregati per Missione.

**Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC**

|    | Fondi RRF (€)         | Fondi PNC (€)       | FOI (€)              | Fondi Ente (€)      | altri fondi (€) | Totale (€)            |               |
|----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| M1 | 14.000,00             |                     |                      |                     |                 | 14.000,00             | 0,0%          |
| M2 | 24.000.000,00         |                     | 2.400.000,00         |                     |                 | 26.400.000,00         | 9,3%          |
| M4 | 102.335.225,32        |                     | 6.099.190,72         | 729.582,90          |                 | 109.163.998,94        | 38,5%         |
| M5 | 127.853.728,50        | 2.407.682,15        | 14.534.793,20        | 3.512.956,20        | 6.000,00        | 148.315.160,05        | 52,2%         |
|    | <b>254.202.953,82</b> | <b>2.407.682,15</b> | <b>23.033.983,92</b> | <b>4.242.539,10</b> | <b>6.000,00</b> | <b>283.893.158,99</b> | <b>100,0%</b> |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS (12-12-2023).


Città metropolitana risulta essere soggetto attuatore per un ammontare complessivo di fondi del PNRR e del PNC pari a 254 milioni e un importo totale complessivo di risorse dell'Ente e di altri fondi pubblici pari a 284 milioni.

La Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) accentra il 52,2 per cento dei fondi complessivi di cui Città metropolitana risulta titolare in quanto soggetto attuatore, mentre la Missione 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido) il 38,5 per cento.

---

obiettivo raggiunto e verificato. Questo comporta un anticipo di cassa, da parte dell'ente beneficiario. Sono inoltre finanziabili con i contributi assegnati anche le spese sostenute antecedentemente alla pubblicazione del bando (ma non prima della data riportata nei singoli bandi) e finanziate con risorse proprie, così come sono ammessi anche interventi effettuati in economia con personale interno.

**Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC**

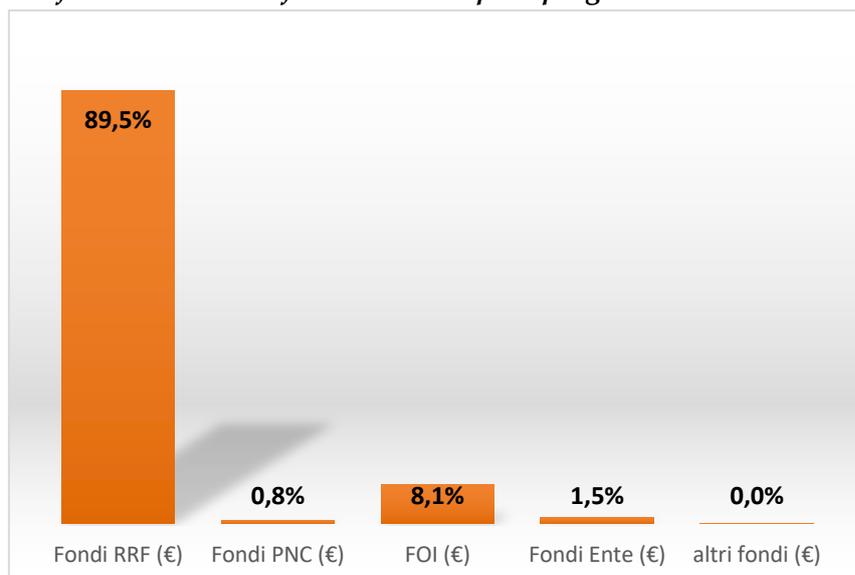

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS (12-12-2023).

La Sezione ha potuto accertare che le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono all' 89,5 per cento del totale, mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), ovvero i fondi pubblici nazionali che affiancano il PNRR e che seguono sia per la rendicontazione sia per l'attuazione le stesse procedure del PNRR, sono pari a 2,4 milioni, ovvero lo 0,8 per cento del totale: le risorse del PNC sono destinate ad integrare il finanziamento di alcuni progetti del PNRR nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità). Il resto delle risorse proviene dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI)<sup>7</sup>, risorse che contribuiscono con lo 8,1 per cento dei fondi complessivi; infine, l'1,5 per cento dei fondi sono risorse dell'Ente.

Per il dettaglio dei singoli progetti, univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP), si rimanda alla tabella 7 (in calce alla relazione) dove sono elencati i 154 progetti riguardanti sette categorie di intervento all'interno della quattro missioni indicate.

<sup>7</sup> Si tratta di risorse statali stanziare per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate che una serie di fattori eccezionali di ordine geo-politico hanno reso necessario. Il comma 7, dell'art. 26, del d.l. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. L'art. 34, co. 1, del d.l. n. 115/2022 ha incrementato il fondo di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. Per le assegnazioni cfr.: decreti Ragioneria generale dello Stato nn. 154-159-175-183-185-187/2023

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/attivita\\_istituzionali/monitoraggio/piano\\_nazionale\\_per\\_gli\\_investimenti\\_complementari\\_al\\_pnrr/fondo\\_opere\\_indifferibili](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili) Δ).


## 2.1 Avanzamento procedurale

E' stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale partendo dalla documentazione disponibile sulla piattaforma ReGiS all'interno della quale l'avanzamento procedurale viene identificato mediante l'associazione nel tempo ad ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi, rendendone così possibile il monitoraggio. Le possibili fasi dell'attuazione sono così definite: "Progettazione esecutiva", "Pubblicazione bando di gara", "Aggiudicazione", "Stipula contratto", "Esecuzione lavori o Esecuzione fornitura", "Collaudo". Il soggetto attuatore è responsabile del caricamento tempestivo su ReGiS della documentazione che attesti il completamento di ciascuna fase, condizione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria di ciascun progetto (ad esempio, il contratto tra ente e chi esegue l'opera attesta il completamento della fase di aggiudicazione oppure il certificato di conformità dei lavori o di collaudo attesta la conclusione del progetto).

Dopo aver estratto i dati da ReGiS, si è proceduto, con richiesta istruttoria a cui l'Ente ha dato riscontro in data 14 novembre 2023, alla verifica dello stato di attuazione e all'acquisizione di aggiornamenti rispetto alle informazioni contenute sulla piattaforma.

La Sezione sulla base del riscontro ha, dunque, potuto accertare la fase procedurale di ogni singolo progetto del PNRR o del PNC della Città metropolitana di Milano. Il grafico seguente ne fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

**Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase)**

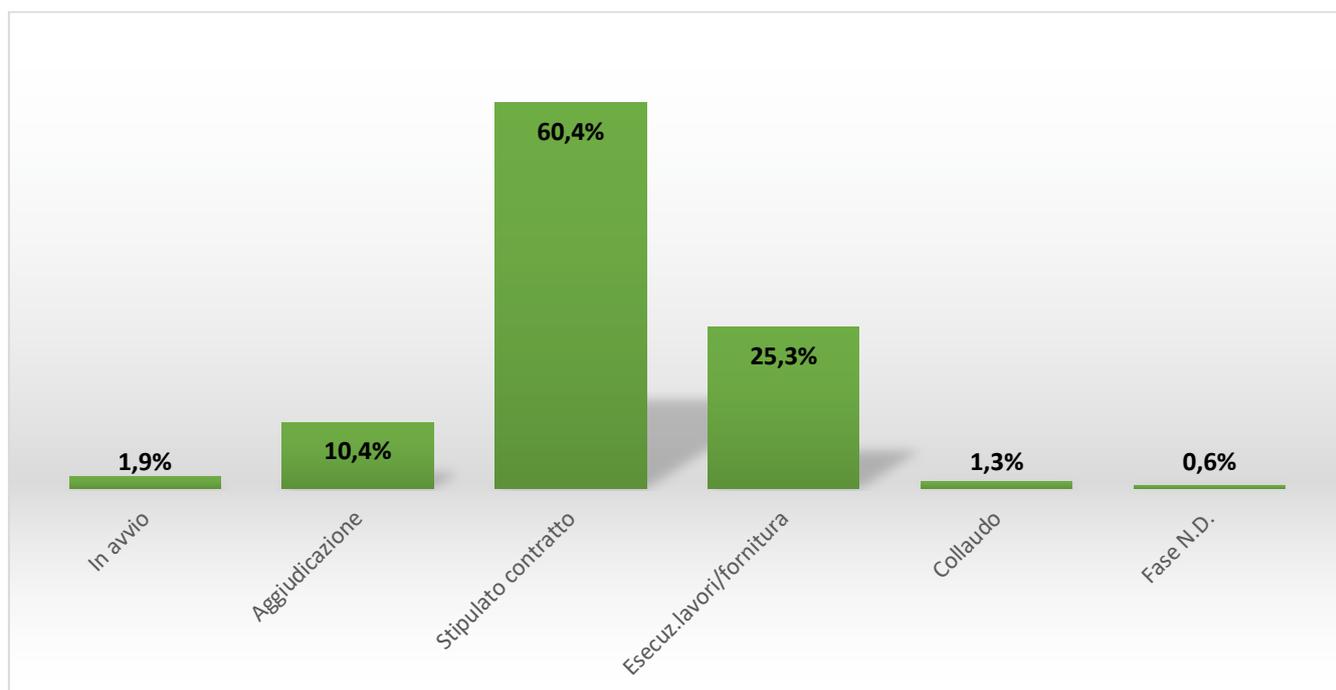

Il grafico mostra come una quota pari a circa il 2 per cento dei progetti sia in fase di avvio; nel 10,4 per cento dei casi, si è nella fase di aggiudicazione dei lavori o della fornitura del servizio mediante gara per individuare il soggetto che dia corso all'esecuzione del progetto; la maggior quota di progetti, pari al 60,4 per cento di CUP, si trova nella fase successiva, ovvero nella fase in cui i lavori o la fornitura sono stati assegnati ad un soggetto esecutore con cui Città metropolitana ha già stipulato un contratto. Nel 25,3 per cento, i lavori sono in fase di esecuzione o i servizi in erogazione. Infine, mentre per lo 0,6 per cento mancano informazioni circa lo stato di attuazione, per l'1,3 per cento dei progetti i lavori o la fornitura sono stati completati.

La tabella che segue riporta lo stato di avanzamento delle procedure per le diverse missioni evidenziando una situazione eterogenea.

**Tabella 3 - Avanzamento procedurale**

|            | In avvio | Aggiudicazione | Stipulato contratto | Esecuz.lavori/fornitura | Collaudo | Fase N.D. | somma CUP  | CUP in linea con cronoprogramma | % CUP in linea con cronoprogramma |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| M1C1-1.4.4 | 1        |                |                     |                         |          |           | 1          | 1                               | 100,0%                            |
| M2C3-1.1   |          |                |                     | 1                       |          |           | 1          | 1                               | 100,0%                            |
| M4C1-1.3   |          | 1              |                     |                         |          |           | 1          | 0                               | 0,0%                              |
| M4C1-3.3   |          |                |                     | 31                      | 2        | 1         | 34         | 30                              | 88,2%                             |
| M5C2-2.2   |          | 5              |                     |                         |          |           | 5          | 4                               | 80,0%                             |
| M5C2-2.2C  |          |                | 90                  |                         |          |           | 90         | 90                              | 100,0%                            |
| M5C2-3.1   | 2        | 10             | 3                   | 7                       |          |           | 22         | 17                              | 77,3%                             |
|            | <b>3</b> | <b>16</b>      | <b>93</b>           | <b>39</b>               | <b>2</b> | <b>1</b>  | <b>154</b> | <b>143</b>                      | <b>92,9%</b>                      |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGIS.

In particolare, si osserva come la maggior parte dei CUP della Missione 4 siano già in fase di esecuzione o conclusi, mentre per i CUP della Missione 5 si sia in una fase precedente, ovvero quella dell'aggiudicazione o di stipula dei contratti. Infine, solo 3 progetti (circa il 2 per cento dei CUP) distribuiti su 2 interventi, sono in fase di avvio.

Per il dettaglio circa lo stato di avanzamento procedurale di ogni singolo progetto si rimanda alla Tabella 8 (in calce alla relazione), dove viene rappresentato lo stato di attuazione per ciascuno dei CUP.

Gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale. Questo implica che i diversi progetti si sviluppano nel rispetto della sequenza temporale all'interno della quale ciascuna fase dell'intervento deve essere completata. Mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (*"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR - DM ripartizione traguardi e obiettivi"*) definisce la data entro la quale gli interventi devono essere conclusi, gli accordi operativi<sup>8</sup> (*"Operational Arrangements"*) stabiliscono le scadenze delle diverse fasi di ciascun intervento del piano.

Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma, la Sezione ha fatto riferimento innanzitutto alle informazioni rilasciate dai revisori dell'Ente così come riportate nella Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 (secondo quanto indicato dalle Linee Guida nella Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR). Ai revisori si chiedeva di indicare se il cronoprogramma stabilito per ogni specifico progetto, identificato mediante CUP, fosse stato rispettato (al 30 giugno 2023).

<sup>8</sup> Si tratta degli accordi che l'Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12-2021):

[https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned\\_-\\_italy\\_-\\_rrf\\_-\\_oa\\_1.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf)

Nel caso dei progetti della Città metropolitana di Milano i revisori avevano riscontrato un ritardo per 16 progetti nell'intervento M5C2-3.1 al termine del I semestre 2023.

Si è dunque deciso di verificare l'allineamento al cronoprogramma per tutti i 154 progetti, con particolare attenzione per i CUP su cui i revisori dei conti dell'Ente avevano rilevato un ritardo.

La Sezione ha potuto appurare, basandosi sul riscontro all'attività istruttoria, verificata alla luce della ultima documentazione caricata sulla piattaforma ReGiS, che alla data del 12 dicembre 2023 dei 16 CUP in ritardo nel primo semestre 2023 soltanto per 3 di questi progetti segnalati dai revisori, permane evidenza di un ritardo rispetto al cronoprogramma anche nel secondo semestre 2023. Tuttavia, risulta che altri 8 progetti (per un totale di 11 progetti) hanno conseguito un ritardo emerso solo nel secondo semestre 2023.

Dunque, in conclusione, all'esito dell'aggiornamento istruttorio e da un controllo sulla piattaforma ReGiS al 12 dicembre 2023, risulta che 143 CUP sono allineati al cronoprogramma, in misura pari al 93 per cento dei progetti. Per quanto riguarda i progetti che risultano in ritardo, la Sezione ha potuto accertare che si tratta di 11 progetti distribuiti tra 4 interventi, nelle Missioni 4 e 5, e che 9 degli 11 progetti in questione sono della tipologia "non nativo PNRR".

Più in particolare si tratta dei seguenti progetti:

- M4C1-1.3 Lavori di riqualifica architettonica e funzionale delle palestre del centro scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia 46/48 - predisposizione spazi da adibire alle attività sportive, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE;
- M4C1-3.3 I.I.S. Bernocchi Legnano (MI), Efficientamento energetico di adeguamento normativo 1° lotto - messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti, i lavori sono stati sospesi (progetto non nativo PNRR);
- M4C1-3.3 IPSAR Vespucci di Milano - rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori, si trova in stato di ESECUZIONE LAVORI (progetto non nativo PNRR);
- M4C1-3.3 I.I.S. Galilei (MI) - recupero laboratorio elettronica da trasformare in aule, rifacimento impermeabilizzazione corpo basso e parti copertura aule, si trova in stato di ESECUZIONE LAVORI (progetto non nativo PNRR);
- M4C1-3.3 Istituto Maggiolini di Parabiago - lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre, si trova in stato di COLLAUDO (progetto non nativo PNRR);

- M5C2-3.1 (PINQUA) Passerella ciclopedonale a scavalco della SP28 in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
- M5C2-3.1 (PINQUA) Collegamenti ciclopedonali con passante ferroviario in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
- M5C2-3.1 (PINQUA) Riqualficazione dei percorsi del Parco delle Stelle Alpine in via delle Rose in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
- M5C2-3.1 (PINQUA) Ampliamento Centro di Formazione Professionale e co-working in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
- M5C2-3.1 (PINQUA) Asilo nido Q.re delle Rose in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
- M5C2-2.2 (PUI 14) Lavori di realizzazione del biciplan metropolitano cambio - linea 2, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE.

La Sezione rileva come, all'esito del controllo al 12 dicembre 2023, meno del 7 per cento (11 su 154) dei progetti della Città metropolitana di Milano risultano in ritardo rispetto al cronoprogramma.

## 2.2 Avanzamento finanziario

La Sezione in sede istruttoria (nota prot. 23712 del 24-10-2023) chiedeva alla Città metropolitana di Milano *“di indicare l'importo accertato in bilancio, a seguito del trasferimento di risorse da Regione o Amministrazione centrale, specificando il totale dei pagamenti effettuati dall'Ente”* per ciascun progetto identificato mediante CUP.

Nel suo riscontro l'Ente ha fornito informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario di ciascun progetto, in particolare relativamente alle risorse complessive accertate in bilancio per l'avvio dei progetti, ovvero provenienti dai trasferimenti statali o regionali.

E' da rilevare come l'art. 15 del d.l. 77/2021 abbia accelerato l'avvio degli interventi, stabilendo che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della

correlata spesa. Inoltre, poiché nel PNRR l'avvio dei progetti precede il finanziamento, per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli investimenti, il decreto-legge n. 152 del 2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", prevede all'art. 9, commi 6 e 7, la possibilità di disporre di anticipi di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.<sup>9</sup> La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso articolo dove si legge: "per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR".

All'esito della attività istruttoria, dunque, la Sezione ha potuto acquisire lo stato delle risorse accertate in bilancio e lo stato dei pagamenti così come riferiti dall'Ente. Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall'Ente in forma di anticipazione, ci si è basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella relazione sul PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025, così come richiesto dalla Sezione delle Autonomie. Le informazioni vengono riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente tabella.

**Tabella 4 - Risorse accertate in bilancio, anticipazioni e pagamenti**

|            | N. CUP     | Totale dei finanziamenti (€) | Anticipazione (€)    | Accertate (€)         | Pagamenti (€)        | Pagamenti su risorse accertate |
|------------|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| M1C1-1.4.4 | 1          | 14.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,0%                           |
| M2C3-1.1   | 1          | 26.400.000,00                | 0,00                 | 7.715.675,00          | 1.208.780,10         | 15,7%                          |
| M4C1-1.3   | 1          | 1.620.000,00                 | 0,00                 | 355.991,50            | 91.352,05            | 25,7%                          |
| M4C1-3.3   | 34         | 107.543.998,94               | 15.821.806,34        | 54.912.114,05         | 13.031.750,47        | 23,7%                          |
| M5C2-2.2   | 5          | 60.003.889,14                | 5.006.785,60         | 29.815.970,18         | 556.140,92           | 1,9%                           |
| M5C2-2.2C  | 90         | 51.216.221,77                | 5.019.405,03         | 8.845.826,06          | 424.327,16           | 4,8%                           |
| M5C2-3.1   | 22         | 37.095.049,14                | 2.999.950,50         | 2.999.950,50          | 2.979.589,57         | 99,3%                          |
|            | <b>154</b> | <b>283.893.158,99</b>        | <b>28.847.947,47</b> | <b>104.645.527,29</b> | <b>18.291.940,27</b> | <b>17,5%</b>                   |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGIS.

La tabella mostra il finanziamento totale, ovvero le risorse a disposizione di Città metropolitana per attuare i progetti del PNRR: le risorse complessive sono costituite, come già esplicitato, dalla somma dei fondi RRF e PNC, da altri finanziamenti pubblici, come ad esempio i due stanziamenti del FOI e dai fondi tratti dal bilancio dell'Ente.


<sup>9</sup> La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso decreto, "per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR".

Le risorse accertate in bilancio, invece, rappresentano solo una parte del finanziamento totale, ovvero solo l'importo dei trasferimenti pubblici (fondi RRF e PNC, FOI e altri finanziamenti pubblici). Si registra una percentuale di risorse accertate pari a 104,6 milioni, ovvero il 37 per cento del finanziamento totale.

Le anticipazioni sono circa 29 milioni e costituiscono il 10,2 per cento delle risorse finanziate queste sono risorse richieste dall'Ente a valere sul fondo di rotazione del MEF per un importo massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento, anche se in casi eccezionali, debitamente motivati, è stato possibile incrementare la quota di anticipazione.

I pagamenti, pari a 18,3 milioni, costituiscono il 17,5 per cento delle risorse accertate. Si notano alcune differenze tra i progetti delle diverse missioni per quanto riguarda l'avanzamento finanziario.

**Grafico 3 - Stato di avanzamento finanziario (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)**

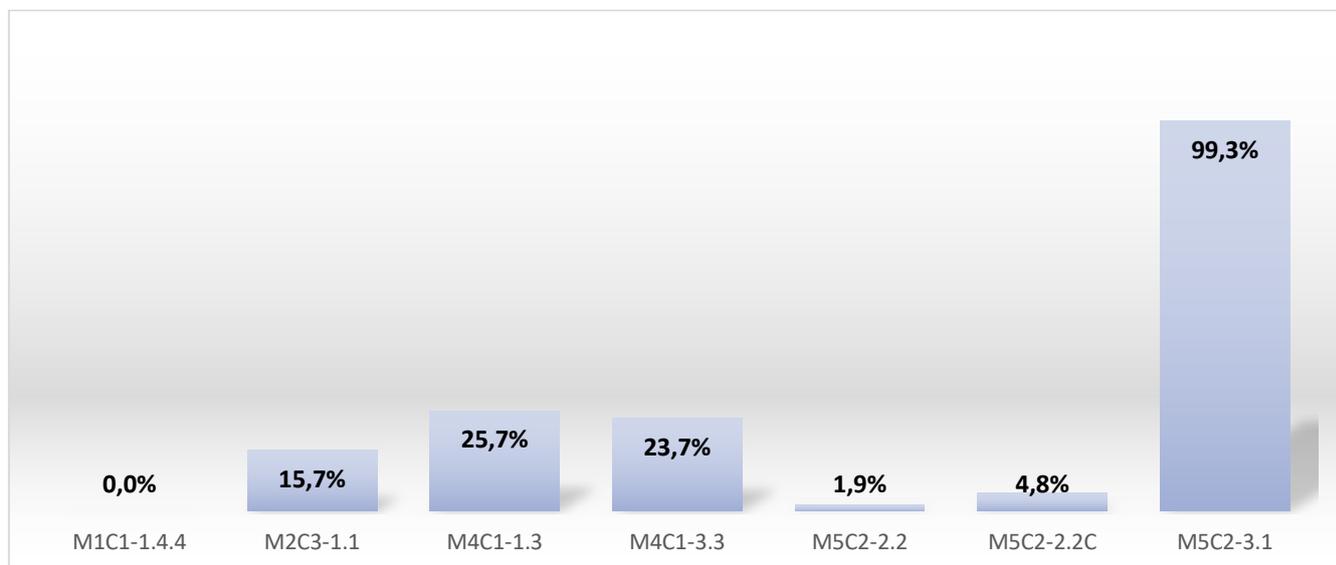

Una maggiore quota di pagamenti su accertato, pari al 99 per cento circa, si rileva nell'intervento M5C2-3.1 (Biciplan), dove sono stati effettuati pagamenti nella misura dell'intero importo anticipato; a seguire l'intervento M4C1-1.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) a denotare che gli interventi sull'edilizia scolastica (quasi interamente "non nativi PNRR", in quanto 33 su 34) sono in fase avanzata oltre che nell'esecuzione, anche dal punto di vista finanziario. Del resto, nella delibera di ricognizione n. 248/2023/GEST si rimarcava come già a dicembre 2022 "In particolare, per l'intervento M4.C1.I.3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", che interessa n. 26 istituti scolastici, risulta che, in alcuni casi i lavori sono stati aggiudicati, in altri risultano in corso di esecuzione e in altri i lavori sono stati ultimati (LC - IM C. Reborà, IIS P. Frisi)."

Per quanto riguarda il dettaglio sullo stato dei pagamenti di ciascun progetto identificato mediante CUP, si rimanda alla Tabella 8 (in calce alla relazione).

La Sezione rileva come il livello dei pagamenti complessivi, pari al 17,5 per cento dei fondi accertati in bilancio, indichi una situazione eterogenea tra i CUP per quanto riguarda la rendicontazione delle spese. Un intervento in particolare (M4C1-3.3), che raccoglie la maggiore quota di progetti “non nativi PNRR”, è non solo in uno stato di attuazione procedurale più avanzato, ma risulta anche con una quota di pagamenti su accertato decisamente superiore agli altri.

### 2.3 Effetti della rimodulazione

Nel giugno 2023 è stata resa pubblica la notizia di una proposta governativa di rimodulazione<sup>10</sup> di alcune misure del PNRR presentata dalla cabina di regia nazionale alla Commissione Europea e che, allo stato attuale, risulterebbe approvata, con un impatto di definanziamento di alcuni interventi.

La proposta in argomento è stata già analizzata per il suo potenziale impatto sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 16/2023/FRG) laddove si osserva che: *“Tra le principali misure di competenza di Comuni e Città metropolitane espunte dal PNRR si annoverano interventi quali quelli relativi alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei centri abitati, iniziative di manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici, nonché di rigenerazione e valorizzazione di aree urbane per le quali sono stati avviati progetti. Ne potrebbe derivare un rallentamento che amplia le difficoltà di realizzare l’ampio parco progetti presentati ed emerge, inoltre, la necessità che le coperture alternative intervengano tempestivamente per evitare l’interruzione dei lavori e il rischio di oneri aggiuntivi.”*

La Sezione ha dunque domandato all’Ente nella sua integrazione istruttoria del 24 ottobre 2023 (Prot. 23712) di specificare quali fossero gli interventi coinvolti dalla prospettata riduzione di risorse. In particolare, si chiedeva a Città metropolitana di relazionare sull’eventuale impatto del definanziamento sotto il profilo degli impegni di spesa e dell’attuazione dei relativi interventi.

La seguente tabella riassume quanto emerso dal riscontro dell’Ente circa gli interventi e gli importi coinvolti.

---

<sup>10</sup> I cui dettagli si trovano nel Dossier “Monitoraggio dell’attuazione del PNRR - Le Proposte del governo per la revisione del PNRR e il capitolo RepowerEU” pubblicato il 31 luglio 2023, a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

**Tabella 5 - Progetti oggetto di possibile definanziamento**

|           |                                    | n.CUP     | non nativi PNRR | Fondi RRF (€)        | Fondi PNC (€)       | Somma RRF e PNC (€)   |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| M5C2-2.2  | Piani Urbani Integrati 14 - CAMBIO | 5         | 0               | 48.865.530,13        | 1.202.325,87        | 50.067.856,00         |
| M5C2-2.2C | Piani Urbani Integrati 13 - SPUGNA | 90        | 0               | 48.988.693,37        | 1.205.356,28        | 50.194.049,65         |
|           |                                    | <b>95</b> | <b>0</b>        | <b>97.854.223,50</b> | <b>2.407.682,15</b> | <b>100.261.905,65</b> |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio (Prot. 24704 del 14-11-2023).

Dagli elementi conoscitivi acquisiti è emerso che i progetti coinvolti dal possibile definanziamento sono 95 distribuiti sui 2 interventi dei Piani Urbani Integrati denominati Cambio e Spugna e che nessuno dei progetti è di tipologia “non nativo PNRR”. L’importo coinvolto è pari a 97,8 milioni del RRF e 2,4 milioni del PNC per un totale di 100 milioni circa, ovvero il 39 per cento se rapportati all’importo risultante della somma di fondi RRF e PNC pari a 256,6 milioni.

L’Ente nel suo riscontro del 13 novembre 2023, in relazione agli interventi coinvolti dalla proposta di definanziamento, ha dichiarato che “Si tratta di interventi tutti già oggetto di procedure di aggiudicazione concluse, nella maggior parte già contrattualizzati od in corso di contrattualizzazione ed a breve termine ne è prevista la cantierizzazione. In sostanza gli interventi oggetto della proposta sono a tutti gli effetti oggetto di obbligazione giuridica in capo al soggetto attuatore Città Metropolitana ed un definanziamento richiederebbe un equivalente finanziamento alternativo, peraltro assicurato nelle dichiarazioni pubbliche del competente Ministro. A tal proposito, in data 12 ottobre 2023 è pervenuta, a firma dei Ministri Fitto e Piantedosi, una richiesta in merito allo stato di avanzamento dei Piani Urbani integrati di competenza di Città metropolitana di Milano, rispetto alla quale, il 19 ottobre, Città Metropolitana ha inoltrato in risposta la Scheda di Ricognizione contenente le informazioni riguardanti l’avanzamento procedurale e finanziario dei singoli interventi. Da tale documentazione emerge lo stato di aggiudicazione degli appalti delle opere e il piano di attivazione degli Ordini di Attivazione dei Lavori, che attualmente sono per la gran parte già sottoscritti.”

Inoltre, l’Ente ha dichiarato, nel suo riscontro a questa Corte che “Una valutazione compiuta degli impatti finanziari, contabili e contrattuali non è possibile senza avere conoscenza dei tempi, modi e condizioni dei promessi finanziamenti alternativi. L’importo residuo degli investimenti relativi a suddetti progetti, al netto di quanto già erogato dai Ministeri competenti per le misure PNRR, è pari a circa 100 milioni di euro. Sebbene l’ente abbia un consistente avanzo destinato agli investimenti (euro 36,5 milioni ancora da applicare), in assenza di nuove risorse tale stock non sarebbe sufficiente per garantire il finanziamento delle opere; allo stesso tempo l’ente non ha intenzione di interrompere la politica finalizzata ad una costante e progressiva riduzione del debito, soprattutto in una fase di tassi elevati quale quella attuale.

Qualora invece il governo proceda ad indicare risorse alternative, si sottolinea l'esigenza della contestualità della provvista rispetto alla eventuale sottrazione del finanziamento PNRR.

Si precisa che le disponibilità di cassa di CMM sono consistenti e non ci sarebbero problemi - nelle more della formalizzazione delle nuove fonti - a far fronte alle prossime scadenze di pagamento con risorse proprie; tuttavia si porrebbe una forte criticità in relazione all'effettiva copertura finanziaria delle opere, che - come è evidente - deve essere garantita ex ante per l'intero ammontare dei quadri economici.


Si sottolinea infine che alla data attuale non è pervenuta a CMM alcuna comunicazione in merito ad un eventuale, prossimo, definanziamento dei progetti; rimane invece l'obbligo di rispettare rigorosamente le milestone ed i target previsti dal PNRR e la conseguente necessità di dare seguito alle fasi di esecuzione degli investimenti, che comporta l'insorgere di obbligazioni giuridiche ed il regolare pagamento delle prestazioni nei tempi di legge."

Anche per questi progetti è possibile osservare lo stato di attuazione procedurale, facendo riferimento a quanto riportato in ReGiS, dopo aver riscontrato gli eventuali aggiornamenti nella interlocuzione con l'Ente.

Mentre i 5 progetti dell'intervento M5C2-2.2 risultano essere in fase di AGGIUDICAZIONE, i 90 progetti dell'intervento M5C2-2.2C risultano tutti essere alla fase della STIPULA DEL CONTRATTO.

È possibile confrontare lo stato di attuazione dei progetti coinvolti dal definanziamento rispetto ai 154 progetti complessivi nel seguente grafico.

**Grafico 4 - Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento**

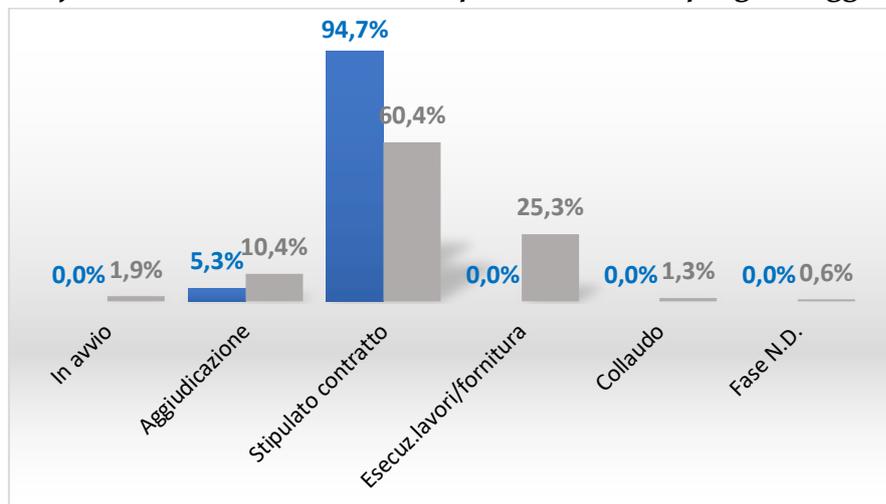

Legenda: con il blu si indica la percentuale dei progetti a seconda della fase di attuazione coinvolti dal definanziamento, mentre in grigio la percentuale sul totale dei 154 progetti.

Il grafico mostra come il 95 per cento dei progetti coinvolti dal definanziamento si trovino nella fase di stipula del contratto, mentre dei 154 progetti complessivi quelli che si trovano in questa stessa fase di attuazione sono meno del 61 per cento.

Per quanto riguarda il rispetto del cronoprogramma di questi interventi, da quanto emerge dai controlli di questa Sezione, solo per 1 progetto sui 95 coinvolti si è verificato un ritardo: si tratta del progetto *“Lavori Di Realizzazione Del Biciplan Metropolitano Cambio - Linea 2”* (CUP I41B22000560001) all'interno dell'intervento PUI *“Cambio”* per cui si è registrato un ritardo di 2 mesi rispetto al cronoprogramma nella fase dell'aggiudicazione.

Infine, rileva osservare come tutti i progetti coinvolti dal possibile definanziamento risultino aver beneficiato del contributo del *“Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili”* (FOI), per un importo complessivo di circa 11 milioni, istituito dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi del PNRR.

La Sezione rileva come la quota degli importi coinvolti sul complesso dei finanziamenti PNRR e PNC appaia di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiede di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente oltre a generare il rischio di oneri aggiuntivi di contenziosi a fronte di opere o forniture aggiudicate o già contrattualizzate.

D'altra parte, va evidenziato come i progetti coinvolti dall'ipotesi di definanziamento siano non solo stati ritenuti meritori del contributo statale per l'avvio delle opere indifferibili, ma si trovino in una fase avanzata di attuazione con conseguente possibilità di completamento, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse.

### 3. PROGETTI CON SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI

L'Ente nel suo riscontro di marzo 2023 ha informato la Corte circa lo stato di avanzamento dei progetti nell'intervento "M5.C2.I 2.2 Piani Urbani Integrati – Come IN" di cui l'Ente non è soggetto attuatore, bensì soggetto beneficiario.

Nella tabella seguente sono elencati i progetti con l'indicazione del Comune soggetto attuatore: si tratta di 34 progetti, di cui nessuno appartenente alla tipologia "non nativi PNRR", che sono finanziati da fondi del RRF, PNC, fondi propri del Comune e stanziamenti FOI 2022 o 2023.

**Tabella 6 - Progetti di cui Città metropolitana non è soggetto attuatore**

| SOGG. ATTUATORE   | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | TOTALE FINANZ. (€) (riscontro ente) | TOTALE FINANZ.(€) (ReGIS) | FASE PROCEDURALE (DENOMINAZ REGIS) | CRONOPROGR. RISPETTATO (ReGIS) |
|-------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Basiglio          | F84H22000040005 | Ristrutturazione Per Realizzazione Dello Spazio A.R.I.A. (Assistenza, Relazione, Individuo, Aiuto)  | 3.620.500,00                        | 3.620.500,00              | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Besate            | J63I22000000007 | Riqualificazione Del Centro Sportivo Comunale   | 699.825,00                          | <b>645.000,00</b>         | AGGIUDICAZIONE                     | NO                             |
| Bollate           | C27H21007260006 | Riqualificazione Del Centro Sportivo Di Via Verdi   | 1.870.000,00                        | 1.870.000,00              | STIPULA CONTRATTO                  | SI                             |
| Bresso            | C79J22001790001 | Nuovo Teatro Civico Sandro Pertini Innovazione E Sostenibilità  | 1.400.000,00                        | 1.400.000,00              | STIPULA CONTRATTO                  | SI                             |
| Buscate           | F48C22000010005 | EDIFICIO Dedicato Alle ASSOCIAZIONI Con Aula Polifunzionale - Via Carducci  | 2.156.403,00                        | <b>1.900.000,00</b>       | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Castano Primo     | H17H21007680002 | Intervento Del Comune Di Castano Primo: Villa Rusconi (Realizzazione Polo Biblio-Museale)   | 1.202.000,00                        | 1.202.000,00              | STIPULA CONTRATTO                  | NO                             |
| Cesano Boscone    | B43C22000050001 | Quartiere Tessera. Centro Civico Via Turati. Riqualificazione Energetica Ed Ampliamento Del Centro Civico, Con Ristrutturazione Funzionale Del Teatro Piana | 4.447.341,20                        | 4.447.341,20              | AGGIUDICAZIONE                     | NO                             |
| Cesate            | I68E22000000001 | Realizzazione Secondo Lotto Ed Ampliamento Del Progetto Centro Polifunzionale, Casa Delle Associazioni E Centro Giovanile Di Via Bellini                    | 547.499,59                          | <b>505.000,00</b>         | AGGIUDICAZIONE                     | NO                             |
| Cinisello Balsamo | C72H22000010006 | Completamento Del Sistema Delle Acque Del Settore Est Del Parco Nord Milano   | 575.025,00                          | 575.025,00                | STIPULA CONTRATTO                  | SI                             |
| Cormano           | B71B22001350006 | Formazione Itinerari Fruitivi Ex Plis Balossa   | 1.208.220,40                        | 1.208.220,40              | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Cornaredo         | F85I22000000007 | Ampliamento Struttura Comunale "Il Melograno"   | 498.700,05                          | <b>538.700,50</b>         | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Corsico           | G59J21015600007 | Interventi Di Riqualificazione Parchi Urbani - Parco Cabassina, Parco Resistenza E Parco Giorgella  | 8.565.839,98                        | 8.565.839,98              | AGGIUDICAZIONE                     | SI                             |
| Cuggiono          | E87B22000000007 | Riqualificazione Di Un Locale Di Villa Annoni Per La Realizzazione Di Un Centro Di Documentazione Sui Flussi Migratori                                      | 319.085,70                          | <b>324.185,70</b>         | AGGIUDICAZIONE                     | NO                             |
| Legnano           | E38I22000040001 | Intervento Di Recupero Del Patrimonio Storico Culturale Presente Lungo Il Fiume Olona A Legnano Bagni Pubblici E Palestra                                   | 4.770.000,00                        | <b>4.770.000,00</b>       | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Morimondo         | H89D21000000006 | Lavori Di Riqualificazione E Restauro Del Complesso Cistercense   | 1.267.860,00                        | <b>1.183.512,00</b>       | AGGIUDICAZIONE                     | NO                             |
| Opera             | B83I22000000001 | Riqualificazione e rifunzionalizzazione del campo sportivo di Noverasco   | 2.530.000,00                        | <b>2.700.000,00</b>       | AGGIUDICAZIONE                     | NO                             |
| Paderno Dugnano   | E62F22000000001 | Intervento di rigenerazione urbana del quartiere di Calderara attraverso  | 684.116,57                          | 684.116,57                | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |

| SOGG. ATTUATORE         | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | TOTALE FINANZ. (€) (riscontro ente) | TOTALE FINANZ.(€) (ReGiS) | FASE PROCEDURALE (DENOMINAZ REGIS) | CRONOPROGR. RISPETTATO (ReGiS) |
|-------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                         |                 | interventi integrati di riutilizzo e valorizzazione funzionale di aree e immobili comunali   |                                     |                           |                                    |                                |
| Paullo                  | E94E21044280001 | Riconversione Dell'edificio Delle Ex Scuole Elementari Di Via. G. Mazzini  | 6.193.279,80                        | <b>6.840.000,00</b>       | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Pero                    | C15E22000130001 | Realizzazione (demolizione e ricostruzione) di un nuovo polo culturale con riqualificazione degli spazi aperti   | 11.500.000,00                       | 11.500.000,00             | ESECUZIONE LAVORI                  | NO                             |
| Pieve Emanuele          | J47B22000030006 | Intervento della rete verde metropolitana: rinaturalizzazione di aree verde dismesse ovvero degradate e aumento delle superfici da riqualificare a verde, con diminuzione delle aree pavimentate tra la via Olmi e via Leoncavallo | 1.010.014,38                        | 1.010.014,38              | STIPULA CONTRATTO                  | SI                             |
| Pioltello               | E69J21013850001 | Recupero della Villa Opizzoni a casa della cultura e delle associazioni  | 6.966.000,00                        | 6.966.000,00              | AGGIUDICAZIONE                     | SI                             |
| Robecchetto Con Induno  | D54E21003700006 | Recupero e riqualificazione fabbricato sito in via Manzoni 6 (ex circolo agricolo) a scopo socio educativo   | 999.979,25                          | 999.979,25                | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Rodano                  | J77H21009480005 | Spazi di inclusione per le comunità metropolitane, di Città metropolitana di Milano riqualificazione area ex municipio vie Roma, Giacomo Matteotti, dell'acquedotto e piazza iv novembre   | 5.821.457,00                        | 5.821.457,00              | AGGIUDICAZIONE                     | NO                             |
| San Colombano Al Lambro | B45F22000520005 | Restauro e risanamento conservativo dell'ex deposito nel castello Belgioioso da destinare a museo e spazio accoglienza   | 967.007,00                          | <b>372.000,00</b>         | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| San Donato Milanese     | J57H21002760001 | Centro polifunzionale di via Parri - interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'edificio  | 4.350.000,00                        | 4.350.000,00              | STIPULA CONTRATTO                  | NO                             |
| San Giorgio su Legnano  | D74E22000130006 | Intervento di "riqualificazione e rifunionalizzazione ex municipio per realizzazione della casa delle associazioni   | 1.032.079,47                        | <b>974.079,47</b>         | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| San Vittore Olona       | G53D22000420001 | Intervento di recupero di immobile sequestrato alla criminalità organizzata da riconvertire a casa rifugio per vittime di violenza e servizi affini  | 803.708,00                          | 803.708,00                | AGGIUDICAZIONE                     | NO                             |
| Sedriano                | G88I22000150001 | Restauro e riqualificazione di beni culturali "Villa Allavena"   | 2.337.500,00                        | 2.337.500,00              | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Segrate                 | B91B21006820001 | Parco dei mulini - area vie Gran Paradiso/via Monviso *lavori di rigenerazione urbana  | 2.443.000,00                        | 2.443.000,00              | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Sesto San Giovanni      | C48I22000080001 | Riqualificazione del quartiere Primavera di Sesto San Giovanni   | 5.836.400,00                        | 5.836.400,00              | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Solaro                  | J83C22000010001 | Recupero sottotetto casa Brollo per ricavare degli spazi sociali ad uso della comunità solarese  | 350.988,92                          | 350.988,92                | STIPULA CONTRATTO                  | NO                             |
| Trezzo Sull'Adda        | G79J22000880004 | Manutenzione straordinaria edificio ex-caserma carabinieri da adibire a cdd  | 1.250.000,00                        | 1.250.000,00              | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
| Turbigo                 | J38I22000110001 | Ristrutturazione e riqualificazione energetica casa delle associazioni   | 4.459.803,00                        | 4.459.803,00              | AGGIUDICAZIONE                     | SI                             |
| Vizzolo Predabissi      | I34J22000010006 | Approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport di via G. Verdi n. 5   | 561.000,00                          | 561.000,00                | ESECUZIONE LAVORI                  | SI                             |
|                         |                 |  | <b>93.244.633,31</b>                | <b>93.015.371,37</b>      |                                    |                                |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio (Prot. 4301 del 27-3- 2023, Prot. Cdc n. 4301) e dei dati ReGiS (29-12-2023).

L'importo complessivo per i 34 progetti, così come emerge dai dati ReGiS, è pari a 93 milioni. La Sezione ha potuto verificare alcune discrasie (evidenziate nelle caselle colorate in azzurro) tra gli importi RRF e PNC della piattaforma di ReGiS e i dati forniti nel suo riscontro dall'Ente a marzo 2023.

Inoltre, da ReGiS emerge come per una quota pari al 35 per cento dei progetti (12 su 34) si registri un ritardo rispetto al cronoprogramma.

L'Ente, nel suo riscontro di marzo 2023, ha voluto specificare come: *“Con riferimento ai dati riguardanti lo stato di avanzamento dei progetti rispetto a milestone e target, si evidenzia che per i progetti Come – IN l'unica fase pertinente al periodo considerato è quella relativa alla presentazione della candidatura.”* Inoltre, che: *“In relazione ai compiti di verifica esercitati da CMM sui soggetti attuatori in termini di ottemperanza a milestone e target dei progetti, nei campi “Note” sono puntualmente riportate eventuali criticità dello stato di avanzamento rispetto alle prossime scadenze. Si precisa infine che i dati e le informazioni sono stati acquisiti dai diversi Comuni; i riferimenti agli atti di accertamento e impegno ed ai dati contabili sono relativi ai rispettivi bilanci.”*

Per quanto attiene alle criticità circa il monitoraggio di Città metropolitana, in qualità di soggetto beneficiario, sullo stato di avanzamento dei progetti si rimanda al paragrafo §4.2.

## 4. SISTEMA DI MONITORAGGIO DI CITTÀ METROPOLITANA

### 4.1 La governance del PNRR

Città metropolitana nel suo riscontro di marzo 2023 ribadiva quanto già riferito alla Sezione in occasione della prima ricognizione (deliberazione n.248/2022/GEST), ovvero che la struttura della governance fosse così delineata:

*“- una Cabina di regia per l’attuazione delle misure del PNRR, presieduta dal Direttore Generale, alla quale partecipano i Direttori di Area, nonché i dirigenti competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Tale struttura esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR, e più in generale con riferimento ai progetti finanziati dall’Unione Europea;*

*- la Segreteria Tecnica della Cabina di regia, costituita nella forma della Direzione di Progetto denominata “Programmi di finanziamento e coordinamento progettazione europea”, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle fonti di finanziamento europee;*

*- la fase attuativa è gestita direttamente dalle Direzioni (Aree e Settori) di line, specificamente individuate in relazione ai compiti ed alle funzioni di competenza, con il supporto dei settori di staff (gestione appalti, gestione finanziaria e gestione delle risorse umane). Ciascuna Direzione competente è responsabile della gestione dei fondi e del rispetto del cronoprogramma ed ha un referente che si interfaccia con la Direzione di Progetto.”*

La Sezione, in quell’occasione, rilevava come *“Da quanto esposto, risulta che la governance del PNRR della Città Metropolitana è articolata in due organismi con compiti distinti: la Segreteria tecnica ha compiti di raccolta delle informazioni e monitoraggio sullo stato di attuazione del PNRR, mentre la Cabina di regia, che è organo di governo e di indirizzo, si rapporta direttamente all’organo politico, ovvero al Sindaco metropolitano, in grado di assumere decisioni strategiche. Secondo l’ente locale, questa scelta dovrebbe garantire la tempestività nell’attivazione di misure correttive in caso di inerzia o ritardi sul cronoprogramma. La Sezione si riserva di valutare l’efficacia di tale modello di governance nei prossimi controlli sull’attuazione del PNRR.”*

La Sezione ha potuto verificare come questa struttura di governance abbia assicurato il rispetto del cronoprogramma per oltre il 93 per cento dei progetti di cui Città metropolitana è soggetto attuatore, denotando un livello di efficacia sinora elevato nella gestione di questi progetti del PNRR. Non altrettanto efficace si è rivelata la gestione dei progetti per la cui attuazione l’Ente si è affidato ai Comuni dell’area metropolitana: per questi progetti il Ministero ha trasferito i fondi direttamente ai soggetti attuatori, fermo restando l’obbligo da parte di Città metropolitana del monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto (come si evince da quanto

previsto all'articolo 4, "Obblighi del Soggetto Attuatore e della Città Metropolitana", dell'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento per il P.U.I. "COME IN - Spazi e servizi di inclusione per le comunità metropolitane" sottoscritto dal Ministero dell'Interno, da Città metropolitana e dal singolo Comune soggetto attuatore, atto fornito dall'Ente su richiesta della Sezione per ciascuno dei Comuni soggetti attuatori esterni).

#### 4.2 Sistema informatico di controllo

Nel suo riscontro di marzo 2023 l'Ente dichiarava che "... per potenziare la funzione di monitoraggio e coordinamento delle attività la Direzione di progetto sta sviluppando internamente un applicativo, che funzioni come gestionale e come sistema di archiviazione, sulla base delle indicazioni fornite nel manuale operativo dei soggetti attuatori pubblicato dal Ministero degli Interni con Decreto del 22/11/2022. L'applicativo sarà uno strumento di condivisione delle informazioni sia internamente a CMM sia con i Comuni soggetti attuatori e sarà di supporto nell'adempimento degli obblighi rendicontativi e di monitoraggio su Regis."

Nel suo riscontro, inoltre, Città metropolitana lamentava il limite posto dal funzionamento della piattaforma ReGiS per cui Città metropolitana, essendo soggetto beneficiario e non attuatore, non ha accesso ai dati dei progetti di cui i Comuni sono i soggetti attuatori (di cui al §3). Infatti, dichiarava che: "Si ritiene a questo proposito di evidenziare che l'attività di verifica e controllo dell'avanzamento dei progetti del PUI "COME IN" attuati dai Comuni è indebolita dall'impossibilità ad oggi di accedere alla specifica sezione di Regis e quindi di monitorare in tempo reale i dati e le informazioni caricate da parte dei Comuni soggetti attuatori."

In merito, la Sezione nella deliberazione n. 248/2022/GEST aveva richiamato l'Ente ad un attento monitoraggio anche sui progetti di cui è soggetto beneficiario nei seguenti termini: "In proposito occorre chiarire che la Sezione nella presente ricognizione ha tenuto conto dell'insieme dei progetti che compongono questo intervento. In ordine alla risposta dell'Ente che asserisce di rivestire la qualità di soggetto beneficiario e non quella di soggetto attuatore, occorre osservare che l'art.1 del D.L.77/2021 definisce come «soggetti attuatori», (i soggetti pubblici) o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Lo stesso decreto, all'art.9 "Attuazione degli interventi del PNRR", prevede che gli enti locali per l'attuazione dei progetti possano avvalersi anche "di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente." Va, inoltre, opportunamente richiamata la legge di bilancio del 30/12/2020, n. 178 in vigore dal 1/1/2021, che all'art.1, comma 1043, stabilisce: <Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa

*nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.>"*

*L'Ente, nel suo riscontro di marzo 2023, aggiungeva come: "Con riferimento alla rendicontazione dei dati dei Comuni soggetti attuatori dei progetti relativi ai Piani Urbani Integrati - PUI "Come in" e Piqua,... la CMM si è dotata di un sistema di supporto e monitoraggio in merito all'esecuzione delle opere ed al rispetto di milestone e target. Il gruppo di lavoro interdirezionale ("Segreteria tecnica", .... istituito presso la Direzione di Progetto Programmi di Finanziamento Europeo svolge attività di raccordo e coordinamento sia con i Ministeri competenti per le diverse misure di finanziamento sia con le iniziative di ANCI in merito. All'interno del predetto gruppo di lavoro sono individuati responsabili per ogni misura, ivi comprese le misure di cui sono soggetti attuatori i Comuni. Quest'ultimi sono stati suddivisi in sottogruppi, ciascuno seguito da un tecnico referente che costituisce il riferimento per ogni informazione e supporto. Al fine di esercitare in maniera più efficace il ruolo di coordinamento e monitoraggio è stato attivato per i Comuni del PUI "Come In" uno sportello settimanale tramite il quale i Comuni possono dialogare attivamente con CMM, sottoponendo quesiti e criticità nello sviluppo del loro progetto, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo."*

La Sezione, nel monitorare l'attuazione dei progetti del PNRR di Città metropolitana di Milano, ha potuto constatare la tempestività dell'aggiornamento delle informazioni di ogni singolo CUP sulla piattaforma ReGiS. Si segnala, inoltre, la completezza delle risposte dell'Ente alle richieste istruttorie della Corte.

Per quanto riguarda, i progetti di cui Città metropolitana risulta soggetto beneficiario la Sezione apprezza l'iniziativa dell'Ente di essersi dotato di un sistema di controllo per il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori, vista la limitazione nell'accesso alla piattaforma ReGiS segnalata dall'Ente ai soggetti beneficiari non attuatori. Dalla evidenza riscontrata, tuttavia, la Sezione ha registrato una percentuale elevata di progetti in ritardo rispetto al cronoprogramma pari al 35 per cento. Si invita, dunque, Città metropolitana a rafforzare gli strumenti di controllo sull'attuazione di questi progetti, data la responsabilità che consegue dalla stipula dell'Atto d'obbligo già menzionato.

## 5. SITUAZIONE DEL PERSONALE

Il controllo sulla gestione dei progetti non può prescindere dalla valutazione sull'adeguatezza del personale addetto alla attuazione del piano.

### 5.1 Esperti della Regione

La Sezione con nota istruttoria del 8/3/2023 (Prot. n. 3231) chiedeva informazioni circa l'eventuale utilizzo del personale esperto assunto dalla Regione, nell'ambito della misura del PNRR M1C1-2.2 *"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance"* per la semplificazione delle procedure amministrative degli enti locali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021<sup>11</sup> col quale veniva stanziata la spesa aveva definito il perimetro dei compiti degli esperti e professionisti assunti dalle Regioni per l'Assistenza Tecnica (TA): *"La TA è finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento a quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR. L'intervento di TA riguarderà pertanto in via prioritaria le procedure desumibili dal PNRR e, in particolare, quelle oggetto di intervento nell'ambito del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77(3) (c.d. decreto Governance). L'Appendice 1 riporta una lista di procedure collegate all'attuazione delle misure di semplificazione previste nell'ambito del PNRR e rilevanti ai fini della riduzione dei tempi o dell'arretrato. Ai fini della definizione del perimetro di operatività dell'assistenza tecnica, ciascun territorio regionale potrà stabilire, sulla base delle criticità e dei colli di bottiglia rilevati, le procedure sulle quali intervenire, eventualmente integrando quelle previste nella lista con altre procedure rilevanti per la specifica realtà locale."*

Per questa misura, finanziata con 38,6 milioni in bilancio dal 2021, Regione Lombardia ha assunto la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi complessi in particolare delle procedure propedeutiche all'implementazione dei progetti del PNRR.

---

<sup>11</sup> Il DPCM del 12 novembre 2021 all'art.1 stabiliva che *"il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, e' erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome."* All'art.2 che *"il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste dal PNRR."* All'art.3 che *"ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento."* Infine, all'art.5 che i Piani territoriali *"sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza."* Con DPCM 29 novembre 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. n.80/2021, di ripartizione delle risorse tra le Regioni, alla Regione Lombardia sono stati assegnati 38.632.000,00 euro per la contrattualizzazione di 123 esperti.

La Città metropolitana nel suo riscontro di marzo 2023, dichiarava che: *“l’Ente NON si è avvalso dei professionisti ed esperti multidisciplinari, selezionati dalla Regione Lombardia, destinati al supporto delle amministrazioni nello svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti. Con riferimento ai Settori Rifiuti e Bonifiche e Qualità dell’Aria Rumore ed Energie si sono svolti incontri informativi con gruppi di esperti regionali ed attività di erogazione di dati che non si sono sviluppati poi in attività di supporto all’attuazione dei progetti PNRR, né nella gestione di procedimenti/attività connesse all’ordinaria attività istituzionale.”*

La Sezione si riserva di valutare eventuali profili di inefficienza in relazione alla scelta di non avvalersi degli esperti selezionati dalla Regione anche alla luce delle informazioni che seguono.

## 5.2 Assunzioni di personale a tempo determinato

La Sezione nella sua nota istruttoria dell’8 marzo 2023 chiedeva informazioni circa le procedure di rafforzamento dell’organico a supporto ai progetti del PNRR.

Nel suo riscontro l’Ente dichiarava che *“L’Amministrazione ha inteso avvalersi della possibilità di reclutare il personale tecnico per il PNRR a valere sui quadri economici dei progetti, in quanto le risorse finanziarie dell’Ente non permettevano neanche di coprire l’attuale turnover di personale, come anche evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento ai Piani di fabbisogno 2022-2024.”*

L’Ente, infatti, prospettando una riduzione dovuta al turnover sul triennio 2022-2024 di 70 unità di personale sulle funzioni fondamentali, ha deciso di procedere ad uno specifico Piano dei fabbisogni (RG n. 120/22) per la realizzazione dei progetti PNRR. Sull’intervento PINQUA *“con determinazione dirigenziale RG n. 6697/2022 (allegata) sono state assunte 2 unità di personale di Specialista tecnico delle infrastrutture di categoria D a tempo determinato a partire dal 30/09/2022 per 30 mesi, eventualmente prorogabili in relazione alla durata del progetto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.”*

Inoltre, *“la previsione di personale tecnico di categoria D a tempo determinato è passata da iniziali 2 unità con il decreto RG n. 120/22 e ad una previsione di ulteriori 5 unità nel decreto RG n. 254/2022, con la possibilità di ulteriori aumenti di personale a tempo determinato nel caso fossero necessari e autorizzati nei quadri economici dei progetti.”*

*“Per tutte le figure l’importo per ciascun dipendente è stato stimato in circa 40.000 € lordi annui comprensivo di oneri riflessi, IRAP e salario accessorio.”*

Città metropolitana dichiarava nel suo riscontro di marzo 2023, di aver avviato le seguenti procedure:

- bando PNRR M2 C3 I1.1 - Istituto Frisi di Milano CUP: I41B22000220006: il candidato selezionato per l'assunzione abbinato dalla Commissione a questo progetto ha trasmesso formale rinuncia all'assunzione;
- bando PNRR M4 C1 I1.3 - Centro scolastico san Donato - CUP: I55F22000390006: il candidato selezionato per l'assunzione abbinato dalla Commissione a questo progetto ha trasmesso formale rinuncia all'assunzione;
- bando PNRR M4 C1 I3.3 - Plesso scolastico Giorgi e Oriani Mazzini - CUP: I45H18000540001: Il candidato selezionato resta in attesa di assunzione;
- bando PNRR M4 C1 I3.3 - Plesso scolastico Vespucci - CUP: I45H18000560001: nessun candidato selezionato per l'assunzione.
- Mentre, per la settima unità prevista, non è stato ancora dato avvio alla procedura.

Nel successivo riscontro di novembre 2023, l'Ente aggiornava la Corte sulla situazione del personale a tempo determinato. Delle 7 posizioni previste, per due delle unità di personale assunte a settembre 2022 sui progetti PINQUA i contratti si sono conclusi anticipatamente in data 1° ottobre 2023, mentre per quanto riguarda l'assunzione delle altre 5 unità, visto che gli interPELLI sui bandi passati non hanno dato esito positivo, la Città metropolitana ha proceduto ad un nuovo bando in data 10 ottobre 2023 per l'aggiornamento e integrazione dell'elenco degli idonei già costituito.

Tra le criticità evidenziate in relazione al personale, nel suo riscontro di marzo 2023 l'Ente dichiarava che *“Le norme in materia di personale riguardanti il PNRR, dettagliate nella circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022, come noto consentono di finanziare mediante risorse del quadro economico dei progetti PNRR esclusivamente competenze di tipo tecnico, presupponendo che gli enti siano in grado di far fronte alle attività di tipo giuridico - amministrativo ed alla rendicontazione mediante risorse ordinarie.”*

In particolare, per quanto riguarda il ruolo di Città metropolitana come stazione unica appaltante anche per i Comuni metropolitanI evidenziava la mancanza di sufficienti risorse con competenze di carattere giuridico amministrativo e finanziario. Sempre nel suo riscontro l'Ente ha affermato che *“... considerata la concomitanza delle scadenze delle opere, che affrontano contemporaneamente le stesse fasi, nel corrente anno **si manifesta una fortissima criticità nella gestione delle gare di appalto**, la cui aggiudicazione costituisce una milestone inderogabile del secondo semestre.”* Tanto che *“Al fine di garantire il risultato, l'Ente ha dovuto ricorrere alla costituzione di una task force trasversale a supporto del Settore appalti (decreto del Segretario Direttore Generale RG n. 2202/2023) sottraendo un contingente numeroso di risorse umane alla gestione dell'attività istituzionale.”*

Inoltre, *“con l'ultima riorganizzazione dell'Ente infine è stato istituito un Ufficio dirigenziale Stazione unica appaltante Monza Brianza, Lodi con l'obiettivo di creare sinergie con le Province di Monza e Brianza e Lodi per l'esercizio delle funzioni di stazione unica.”*

Infine, l'Ente nel suo riscontro lamentava come: *“Anche la ricerca di figure tecniche da inserire nell'organizzazione per l'esecuzione dei progetti PNRR presenta elementi di criticità: la prospettiva di un impiego a tempo determinato, con un trattamento economico equivalente al livello di ingresso nell'area dei funzionari, costituisce nel complesso un'offerta poco competitiva per figure professionali molto ricercate nel mercato del lavoro pubblico e privato, soprattutto vista la necessità di acquisire personale con esperienza e competenza consolidata, in grado di fornire immediato valore aggiunto all'organizzazione ed allo specifico progetto PNRR.”*

## 6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione (marzo 2023) aggiornata al (novembre 2023) si possono formulare le seguenti conclusioni:

- L'Ente risulta soggetto attuatore di 154 progetti per un ammontare complessivo di fondi del PNRR e del PNC pari a 254,2 milioni e un importo totale complessivo di risorse dell'Ente e di altri fondi pubblici pari a 283,8 milioni. Il 52,2 per cento dei fondi complessivi si concentrano nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità), mentre il 38,5 per cento nella Missione 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido). La Missione 5 detiene anche il maggior numero di progetti, 117 su 154, pari al 76 per cento dei CUP. Dei 154 progetti, 49 sono della tipologia progetti "non nativi PNRR".
- Per quanto attiene all'attuazione procedurale, dagli accertamenti effettuati dalla Sezione in seguito all'integrazione istruttoria di ottobre 2023, si riscontra che il 2 per cento dei progetti è in fase di avvio, il 10,4 per cento nella fase di aggiudicazione dei lavori o della fornitura del servizio. La maggiore quota dei progetti, pari al 60,4 per cento di CUP, si trova nella fase in cui i lavori o la fornitura sono stati assegnati ad un soggetto esecutore con cui Città metropolitana ha già stipulato un contratto. Nel 25,3 per cento di CUP, i lavori o i servizi sono in esecuzione, mentre nell'1,3 per cento sono completati.
- All'esito dell'aggiornamento istruttorio di novembre 2023 e da un controllo sulla piattaforma ReGiS al 12 dicembre 2023, risulta che il 93 per cento dei CUP sono allineati al cronoprogramma. Gli 11 progetti in ritardo rispetto al cronoprogramma (di cui 9 progetti "non nativi PNRR"), poco meno del 7 per cento del totale, risultano distribuiti tra 4 interventi, e segnatamente:
  - M4C1-1.3 Lavori di riqualifica architettonica e funzionale delle palestre del centro scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia 46/48 - predisposizione spazi da adibire alle attività sportive, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE;
  - M4C1-3.3 I.I.S. Bernocchi Legnano (MI), Efficientamento energetico di adeguamento normativo 1° lotto - messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti, i lavori sono stati sospesi (progetto non nativo PNRR);
  - M4C1-3.3 IPSAR Vespucci di Milano - rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori, si trova in stato di ESECUZIONE LAVORI (progetto non nativo PNRR);

- M4C1-3.3 I.I.S. Galilei (MI) - recupero laboratorio elettronica da trasformare in aule, rifacimento impermeabilizzazione corpo basso e parti copertura aule, si trova in stato di ESECUZIONE LAVORI (progetto non nativo PNRR);
  - M4C1-3.3 Istituto Maggiolini di Parabiago - lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre, si trova in stato di COLLAUDO (progetto non nativo PNRR);
  - M5C2-3.1 (PINQUA) Passerella ciclopedonale a scavalco della SP28 in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
  - M5C2-3.1 (PINQUA) Collegamenti ciclopedonali con passante ferroviario in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
  - M5C2-3.1 (PINQUA) Riqualificazione dei percorsi del Parco delle Stelle Alpine in via delle Rose in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
  - M5C2-3.1 (PINQUA) Ampliamento Centro di Formazione Professionale e co-working in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
  - M5C2-3.1 (PINQUA) Asilo nido Q.re delle Rose in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);
  - M5C2-2.2 (PUI 14) Lavori di realizzazione del biciplan metropolitano cambio - linea 2, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE.
- Per quanto concerne l'avanzamento finanziario, la Sezione ha registrato una percentuale di risorse accertate pari al 37 per cento del finanziamento totale, di cui il 10,2 per cento sono anticipazioni. I pagamenti complessivi sono pari a 18,3 milioni, ovvero il 17,5 per cento dei fondi accertati in bilancio, con una certa eterogeneità tra i CUP in termini di rendicontazione delle spese.
  - In relazione alla proposta governativa di definanziamento, approvata dalla Commissione Europea, Città metropolitana dichiara essere potenzialmente coinvolti 95 progetti per un importo pari a 100 milioni circa, ovvero il 39 per cento se rapportati all'importo risultante della somma di fondi RRF e PNC pari a 256,6 milioni. Una quota pari al 95 per cento dei progetti coinvolti dal definanziamento si trovano nella fase di stipula del contratto, ben superiore al 61 per cento dei progetti complessivi in questa stessa fase di attuazione. Da quanto emerge dai controlli di questa Sezione, solo in un caso si è verificato un ritardo: si tratta del progetto "Lavori Di Realizzazione Del Biciplan Metropolitano Cambio - Linea 2" (CUP I41B22000560001) all'interno dell'intervento PUI "Cambio" per cui si è

registrato un ritardo di 2 mesi rispetto al cronoprogramma nella fase dell'aggiudicazione.

- La Sezione rileva che, innanzitutto la lista dei progetti passibili di definanziamento è ancora incerta, che la loro quota sul complesso degli interventi PNRR e PNC appare di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiede di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente, oltre che rischio di contenziosi ed oneri di spesa aggiuntivi. D'altra parte, va evidenziato come i progetti coinvolti dall'ipotesi di definanziamento siano non solo stati considerati meritori del contributo statale per l'avvio delle opere indifferibili (FOI), ma si trovino in una fase avanzata di attuazione con conseguente possibilità di completamento, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse. La Sezione auspica un repentino superamento dell'incertezza circa la lista dei progetti coinvolti e riserva alle successive verifiche sull'attuazione del PNRR una valutazione degli effetti del definanziamento e l'esame delle misure messe in campo dall'Ente a salvaguardia degli equilibri di bilancio e degli impegni contrattuali.
- Città metropolitana risulta beneficiaria di 93 milioni per 34 progetti la cui attuazione è in capo ad altrettanti comuni dell'area metropolitana. La Sezione ha potuto verificare alcune discrasie tra gli importi RRF e PNC registrati sulla piattaforma ReGiS e i dati forniti nel suo riscontro dall'Ente (marzo 2023): del resto l'Ente dichiara di non avere accesso alle informazioni relative a questi progetti sulla piattaforma ReGiS in fase di monitoraggio. Per 12 dei 34 progetti, pari al 35 per cento, emerge un ritardo rispetto alla fase prevista nel cronoprogramma.
- La Sezione ha potuto verificare come la struttura di governance adottata dall'Ente abbia assicurato il rispetto del cronoprogramma per oltre il 93 per cento dei progetti, di cui Città metropolitana è soggetto attuatore, denotando un livello di efficacia sinora elevato nella gestione dei progetti del PNRR.
- Inoltre, nel monitorare l'attuazione dei progetti del PNRR, questa Sezione ha potuto constatare come Città metropolitana di Milano provveda con tempestività all'aggiornamento delle informazioni di ogni singolo CUP sulla piattaforma ReGiS. L'Ente, inoltre, ha agevolato l'attività di controllo, fornendo risposte puntuali alle richieste istruttorie.
- Si riscontra una minore efficienza del controllo sui progetti di cui Città metropolitana è soggetto beneficiario per i quali l'Ente non ha accesso alla

piattaforma ReGiS. Per detti interventi si registra, infatti, una percentuale di ritardo rispetto al cronoprogramma (pari al 35 per cento) superiore agli interventi di cui Città metropolitana è soggetto attuatore (pari a circa il 7 per cento). Si invita, l'Ente a rafforzare gli strumenti di controllo sulla attuazione di questi progetti, date le responsabilità connesse al monitoraggio in conseguenza della sottoscrizione dell'Atto d'obbligo intervenuto tra Ministero dell'Interno, Città metropolitana e i singoli Comuni attuatori.

- Da quanto emerge dalle risposte della Città metropolitana, l'Ente non si è avvalso del supporto degli esperti assunti dalla Regione, senza tuttavia motivarne le ragioni.
- Infine, Città metropolitana ha segnalato quale aspetto critico della norma sulle assunzioni di personale a tempo determinato sui fondi del PNRR, la limitazione ad alcuni profili tecnici e non già amministrativi-giuridici. L'Ente avrebbe avuto necessità di rafforzare il personale con competenze amministrative per gestire le molteplici procedure di appalto. Inoltre, è emerso che, delle 7 posizioni bandite, due rapporti si sono conclusi anticipatamente, mentre le restanti procedure sono state riaperte per l'aggiornamento e integrazione dell'elenco degli idonei già costituito, evidenziando una ridotta capacità di attrazione su queste posizioni.

**Tabella 7 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti del PNRR e PNC - Città metropolitana**

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | MISSIONE/COMPONENTE   | Tipologia progetto | TOTALE (€)      |
|----|------------|-----------------|--|---|--------------------|-----------------|
| 1  | M1C1-1.4.4 | I41F22001870006 | Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe   | M1.C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA                                    |                    | 14.000,00 €     |
| 2  | M2C3-1.1   | I41B22000220006 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SEDE SUCCURSALE ISTITUTO P FRISI VIA AMORETTI 6163 MILANO  | M2.C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici                                |                    | 26.400.000,00 € |
| 3  | M4C1-1.3   | I55F22000390006 | LAVORI DI RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE MI VIA MARTIRI DI                                  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università |                    | 1.620.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I22E16000080001 | ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 1.900.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I28B20000190001 | LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE - RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 600.000,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I37H18002270001 | IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 9.284.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I38B20000120001 | I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) - RECUPERO DELLA PALESTRA, ATTUALMENTE DESTINATA A MAGAZZINO, DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE                      | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 300.000,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I38B20000130001 | I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) - MANUTENZIONE STAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli                            | non nativo PNRR    | 210.000,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I38B20000460001 | I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI             | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 2.200.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I41B22000440006 | COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE DI VIA BEATRICE DESTE DEL LICEO REBORA DI RHO   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 2.350.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I43D22000550006 | EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MILANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE "MENSA"  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università |                    | 545.300,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I43G16000420003 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI-VIA SODERINI-ZONA ABCDE MEDIANTE LUSO DI MATERIA                    | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli                            | non nativo PNRR    | 9.619.920,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I44D22003010001 | SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LSTITUTO LEONARDO DA VINCI DI VIA RESPIGHI 7 A MILANO   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 816.860,00 €    |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | MISSIONE/COMPONENTE   | Tipologia progetto | TOTALE (€)      |
|----|------------|-----------------|--|---|--------------------|-----------------|
| 4  | M4C1-3.3   | I44D22003020001 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI IN VIA DEVINCENTI A MILANO                    | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 5.000.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I44D22003030001 | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGICO PRESSO L'ISTITUTO SCHIAPPARELLI GRAMSCI VIA SETTEMBRINI 4 MIL      | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 2.400.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I44D22003040006 | INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO MILANO  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 7.803.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I45F22000120006 | RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO SCOLASTICO PUECHER DI VIA ULISSE DINI MILANO CUP   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 930.000,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I45H18000540001 | ISTITUTO SCOLASTICO GIORGI MAZZINI MILANO - LAVORI DI AMPLIAMENTO  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 14.456.559,53 € |
| 4  | M4C1-3.3   | I45H18000550001 | ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 2.200.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I45H18000560001 | ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 11.184.823,38 € |
| 4  | M4C1-3.3   | I47H18002070005 | LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI VIA LATTANZIO 38 MILANO   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 2.197.041,71 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I47H20003430001 | IP SAR VESPUCCI DI MILANO - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI                               | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 1.500.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B18000140009 | LC REBORA DI RHO - ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 600.000,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B18000160001 | REBORA - VIA B. D'ESTE A RHO - RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC.  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 1.650.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B18000200001 | ITIS FELTRINELLI MILANO - COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 3.800.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B19000000009 | IPSTC KANDINSKY MILANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 1.700.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B19000010009 | IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO                             | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 650.000,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B20000200001 | I.I.S. GALILEI (MI) - RECUPERO LABORATORIO ELETTRONICA DA TRASFORMARE IN AULE, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO                  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 700.000,00 €    |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | MISSIONE/COMPONENTE   | Tipologia progetto | TOTALE (€)      |
|----|------------|-----------------|--|---|--------------------|-----------------|
|    |            |                 | BASSO E PARTI COPERTURA AULE   |   |                    |                 |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B20000280001 | EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - MILANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 1.540.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I51D20000260001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI                                   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 1.500.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I57J20000000001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 6.718.427,10 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I58B20000300001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA  | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 2.200.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I68B20000160001 | ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 600.000,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I69J21000980001 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEI CENTRI SCOLASTICI GALLARATESE                        | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 4.022.067,22 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I71B22000310006 | REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL LICEO GIORDANO BRUNO SUCCURSALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N 110 CASSANO DADDA MILANO                           | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 2.350.000,00 €  |
| 4  | M4C1-3.3   | I88B20000240001 | ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE                             | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 210.000,00 €    |
| 4  | M4C1-3.3   | I98B20000230001 | IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - II° LOTTO   | M4.C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università | non nativo PNRR    | 3.806.000,00 €  |
| 5  | M5C2-2.2   | I31B22000900001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore                            |                    | 12.175.672,52 € |
| 5  | M5C2-2.2   | I31B22000910001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore                            |                    | 16.464.011,51 € |
| 5  | M5C2-2.2   | I41B22000550001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore                            |                    | 17.572.553,10 € |
| 5  | M5C2-2.2   | I41B22000560001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 2   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore                            |                    | 1.679.589,81 €  |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | MISSIONE/COMPONENTE  | Tipologia progetto | TOTALE (€)      |
|----|------------|-----------------|---|--|--------------------|-----------------|
| 5  | M5C2-2.2   | I91B22000690001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12             | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 12.112.062,20 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I18E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - MARCALLO CON CASONE - ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI                        | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 544.312,56 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I18E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - ROSATE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO                                | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 257.190,26 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I18E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - ROSATE - ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA                            | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 431.194,35 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I18E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - ROSATE - ALLEGGERIMENTO VIA DUSE  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 309.461,43 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000010001 | PUI 13 - SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 516.614,21 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI                     | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 129.652,16 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA                        | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 491.126,29 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI                           | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 462.298,43 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI COLOGNO MONZESE    | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 322.665,70 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI COLOGNO MONZESE    | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.238.711,56 €  |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA                     | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 991.253,82 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA                   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 366.130,44 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI                | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 341.932,82 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI                    | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 373.091,40 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000110001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO CENTRALE COLOGNO MONZESE | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.126.429,63 €  |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - ARLUNO - ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI                               | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 529.544,91 €    |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | MISSIONE/COMPONENTE  | Tipologia progetto | TOTALE (€)     |
|----|------------|-----------------|---|--|--------------------|----------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - CANEGRATE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO                                | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 345.656,90 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - CANEGRATE - DISCONNESSIONE VIA BORMIO                                 | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 611.271,15 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE                        | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 533.559,78 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESS  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 747.628,98 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI                                | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 146.854,04 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - Disconnessione Via Rossini                                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 601.034,98 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA                                | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 356.619,85 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA PODGORA                                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 330.659,24 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000110001 | PUI 13 - SPUGNA - TURBIGO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI                     | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.573.270,80 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 110.604,76 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18              | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 202.825,11 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18    | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 90.892,45 €    |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - ALLEGGERIMENTO VIA 1 MAGGIO                                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 113.197,60 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO        | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 339.601,57 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI                                 | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 456.610,17 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA EDISON                                     | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 178.559,70 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - BUSCATE - DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA                           | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 344.669,83 €   |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | MISSIONE/COMPONENTE  | Tipologia progetto | TOTALE (€)   |
|----|------------|-----------------|---|--|--------------------|--------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 217.266,55 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000110001 | PUI 13 - SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO)  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 368.634,66 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000120001 | PUI 13 - SPUGNA - CESANO BOSCONO - DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA' PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 390.398,05 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000130001 | PUI 13 - SPUGNA - CESANO BOSCONO - DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 694.915,05 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000140001 | PUI 13 - SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 397.100,68 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000150001 | PUI 13 - SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA)  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 232.070,19 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000160002 | PUI 13 - SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 571.505,08 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000170001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 229.902,89 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000180001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 243.204,18 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000200001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTEGRAPPA   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 103.479,21 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000210001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI - CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 471.715,78 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000230001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 127.662,82 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000240001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 337.438,45 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000250001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA PASOLINI  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 552.389,47 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000270001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 540.144,67 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000280001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA ZARA   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 718.636,16 € |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | MISSIONE/COMPONENTE  | Tipologia progetto | TOTALE (€)     |
|----|------------|-----------------|--|--|--------------------|----------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000290001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA                                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.166.476,21 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000300001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI              | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 510.841,74 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000310001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA - BERSAGLIO                | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.180.503,00 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000320001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA                                   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 826.438,39 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000330001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA NENNI                                       | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 329.154,73 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000340001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA. CARDINAL FERRARI - CONCILIAZIONE           | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 288.069,90 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000350001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA                                       | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 358.570,72 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000360001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO                                   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 408.769,11 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I58E22000010001 | PUI 13 - SPUGNA - CORSICO - ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI       | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 982.353,61 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I58E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN VITTORE OLONA - ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO                   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 279.099,53 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I68E22000010001 | PUI 13 - SPUGNA - CESATE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE                         | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 335.344,85 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I68E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - PADERNO DUGNANO - ALLEGGERIMENTO VIA SERRA-PADERNO DUGNANO           | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.673.655,41 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I68E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - TREZZANO SUL NAVIGLIO - ALLEGGERIMENTO VIA PRATI                     | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 246.047,13 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I68E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - TREZZANO SUL NAVIGLIO - DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA - VIA GIOIA     | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 930.619,37 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - BRESCO - DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO                               | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 114.525,45 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - BRESCO ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE                                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 272.247,09 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - CINISELLO BALSAMO RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.405.415,78 € |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | MISSIONE/COMPONENTE  | Tipologia progetto | TOTALE (€)     |
|----|------------|-----------------|---|--|--------------------|----------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - CORMANO - ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI - DEI BRAVI  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 231.836,58 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - CORMANO - ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.206.876,37 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - MELEGNANO - DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 452.740,95 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - Disconnessione Piazzale della Costituzione (area mercato di via Aldo Moro) | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 789.716,27 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 458.621,92 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - ALLEGGERIMENTO VIA STURZO  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 285.922,67 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - CORNAREDO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.526.502,46 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA                                | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 511.861,27 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate                                   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 239.651,82 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.144.823,19 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 182.934,34 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - DISCONNESSIONE VIA STAFFORA   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 610.684,52 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 364.836,71 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 503.608,28 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA VIA LOMBARDI  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 789.244,99 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000110001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 761.447,99 €   |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | MISSIONE/COMPONENTE  | Tipologia progetto | TOTALE (€)     |
|----|------------|-----------------|--|--|--------------------|----------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000140001 | PUI 13 - SPUGNA - SOLARO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI                           | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.633.491,53 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000150001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA GOGOL                             | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 308.921,81 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000160001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA MONTENERO                         | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 691.453,40 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000170001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 451.118,00 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000180001 | PUI 13 - SPUGNA - SEDRIANO - RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI                                      | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.671.389,12 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I98E22000000001 | PUI 13 - SPUGNA - BARANZATE - RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA                      | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 1.979.792,53 € |
| 6  | M5C2-2.2C  | I98E22000010001 | PUI 13 - SPUGNA - BARANZATE - RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN)                    | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 828.425,93 €   |
| 6  | M5C2-2.2C  | I98E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - SEGRATE - ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI - VIA BUOZZI                          | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 570.596,33 €   |
| 7  | M5C2-3.1   | B81I21000020005 | PINQUA-Edificio SAP di via Brisa in Comune di Parabiago  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 350.000,00 €   |
| 7  | M5C2-3.1   | B85H21000210005 | PINQUA-Edificio ponte comparto ex Rede in Comune di Parabiago                                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 6.650.000,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | C41B21000070001 | PINQUA-Realizzazione pista ciclabile in prossimità degli interventi 451 e 452 in Comune di Rho | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 330.498,30 €   |
| 7  | M5C2-3.1   | C41I21000020001 | PINQUA-Riqualificazione energetica dell'edificio SAP di via Rosselli n. 4 in Comune di Rho     | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 1.254.736,45 € |
| 7  | M5C2-3.1   | C41I21000030001 | PINQUA-Riqualificazione energetica dell'edificio SAP di via Rosselli n. 8 in Comune di Rho     | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 1.231.966,45 € |
| 7  | M5C2-3.1   | C91B21000060005 | PINQUA-Passerella ciclopedonale in Comune di Baranzate   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 1.226.262,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | C95D21000020005 | PINQUA-Ampliamento edificio ECOCASE SAP e orti collettivi in Comune di Baranzate               | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 903.000,00 €   |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | MISSIONE/COMPONENTE  | Tipologia progetto | TOTALE (€)     |
|----|------------|-----------------|---|--|--------------------|----------------|
| 7  | M5C2-3.1   | C97H21000140005 | PINQUA-Percorso ciclopedonale via Aquileia in Comune di Baranzate   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 214.552,80 €   |
| 7  | M5C2-3.1   | C99H21000000005 | PINQUA-Ristrutturazione ed ampliamento edificio ex rurale in Comune di Baranzate                                | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 2.386.142,60 € |
| 7  | M5C2-3.1   | D25B18003230001 | PINQUA-Recupero Villa Citterio in Comune di Cologno Monzese   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 2.216.084,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | E34C21000000001 | PINQUA-Corte Torre Amigazzi in Comune di Rescaldina   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 5.000.000,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | E38C20000320001 | PINQUA-Casa del Balilla in Comune di Legnano  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 2.624.850,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | E38C20000330001 | PINQUA-Edificio via Galvani 3 in Comune di Legnano  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 963.145,74 €   |
| 7  | M5C2-3.1   | E38C20000340001 | PINQUA-Edificio via dei Mille 12 in Comune di Legnano   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore |                    | 2.780.000,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | J41B21000170001 | PINQUA-Passerella ciclopedonale a scavalco della SP28 in Comune di Pieve Emanuele                               | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 1.180.000,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | J41B21000180001 | PINQUA-Collegamenti ciclopedonali con passante ferroviario in Comune di Pieve Emanuele                          | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 538.000,00 €   |
| 7  | M5C2-3.1   | J43D21000000001 | PINQUA-Riqualficazione dei percorsi del Parco delle Stelle Alpine in via delle Rose in Comune di Pieve Emanuele | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 95.500,00 €    |
| 7  | M5C2-3.1   | J47H21000220001 | PINQUA-Ampliamento Centro di Formazione Professionale e co-working in Comune di Pieve Emanuele                  | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 1.630.000,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | J47H21000230001 | PINQUA-Asilo nido Q.re delle Rose in Comune di Pieve Emanuele   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 1.430.000,00 € |
| 7  | M5C2-3.1   | J81E21000060005 | PINQUA-Riqualficazione Piazza Cadorna in Comune di Solaro   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 1.171.811,40 € |
| 7  | M5C2-3.1   | J81E21000070005 | PINQUA-Percorso ciclopedonale di connessione tra gli interventi 441 e 443 in Comune di Solaro                   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 666.627,10 €   |
| 7  | M5C2-3.1   | J81I21000010005 | PINQUA-Edificio housing sociale in Comune di Solaro   | M5.C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | non nativo PNRR    | 2.251.872,30 € |

| N. | INTERVENTO | CUP | DENOMINAZIONE PROGETTO | MISSIONE/COMPONENTE | Tipologia progetto | TOTALE (€)       |
|----|------------|-----|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|    |            |     |                        |                     |                    | 283.893.158,99 € |

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS

**Tabella 8 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione**

| N. | INTERVENTO | CUP              | DENOMINAZIONE PROGETTO  | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|------------------|---|--|--|---|---------------------------------|
| 1  | M1C1-1.4.4 | I41F22001870006  | Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe  | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA            | SI   | SI  | 0%                              |
| 2  | M2C3-1.1   | I41B22000220006  | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SEDE SUCCURSALE ISTITUTO P FRISI VIA AMORETTI 6163 MILANO   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 15,7%                           |
| 3  | M4C1-1.3   | I55F22000390006  | LAVORI DI RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE MI VIA MARTIRI DI                                   | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | NO  | 25,7%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I22E16000080001  | ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 21,3%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I28B20000190001  | LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE - RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 47,8%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I37H18002270001  | IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 14,0%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I38B20000120001  | I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) - RECUPERO DELLA PALESTRA, ATTUALMENTE DESTINATA A MAGAZZINO, DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE                       | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 97,3%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I38B20000130001  | I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 80,8%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I38B20000460001  | I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI              | LAVORI SOSPESI                         | SI   | NO  | 56,9%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I41B220000440006 | COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE DI VIA BEATRICE DESTE DEL LICEO REBORA DI RHO  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | N.D.                            |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|--|--|--|---|---------------------------------|
| 4  | M4C1-3.3   | I43D22000550006 | EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MILANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE "MENSA"                              | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 4,2%                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I43G16000420003 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI-VIA SODERINI- ZONA ABCDE MEDIANTE LUSO DI MATERIA | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 26,2%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I44D22003010001 | SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI VIA RESPIGHI 7 A MILANO  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | N.D.                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I44D22003020001 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI IN VIA DEVINCENTI A MILANO                            | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | N.D.                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I44D22003030001 | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LISTITUTO SCHIAPPARELLI GRAMSCI VIA SETTEMBRINI 4 MIL             | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | N.D.                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I44D22003040006 | INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO MILANO  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | N.D.                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I45F22000120006 | RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO SCOLASTICO PUECHER DI VIA ULISSE DINI MILANO CUP   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | N.D.                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I45H18000540001 | ISTITUTO SCOLASTICO GIORGI MAZZINI MILANO - LAVORI DI AMPLIAMENTO  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 6,8%                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I45H18000550001 | ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 11,6%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I45H18000560001 | ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 6,1%                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I47H18002070005 | LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI VIA LATTANZIO 38 MILANO   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 41,1%                           |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|--|--|--|---|---------------------------------|
| 4  | M4C1-3.3   | I47H20003430001 | IPSAR VESPUCCI DI MILANO - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | NO  | 35,4%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B18000140009 | LC REBORA DI RHO - ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 3,8%                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B18000160001 | REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO - RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC.   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 78,9%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B18000200001 | ITIS FELTRINELLI MILANO - COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO                 | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 10,1%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B19000000009 | IPSTC KANDINSKY MILANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 67,9%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B19000010009 | IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO   | COLLAUDO                               | SI   | SI  | 44,8%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B20000200001 | I.I.S. GALILEI (MI) - RECUPERO LABORATORIO ELETTRONICA DA TRASFORMARE IN AULE, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E CORPO BASSO E PARTI COPERTURA AULE   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | NO  | 78,5%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I48B20000280001 | EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - MILANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSO DEI COPPI DELLA COPERTURA | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 50,1%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I51D20000260001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTOVENTILAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI                                    | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 0,0%                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I57J20000000001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 1,6%                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I58B20000300001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 18,8%                           |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|---|--|--|---|---------------------------------|
| 4  | M4C1-3.3   | I68B20000160001 | ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 54,8%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I69J21000980001 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEI CENTRI SCOLASTICI GALLARATESE | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 3,1%                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I71B22000310006 | REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL LICEO GIORDANO BRUNO SUCCURSALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N 110 CASSANO DADDA MILANO    | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | N.D.                            |
| 4  | M4C1-3.3   | I88B20000240001 | ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE      | COLLAUDO                               | SI   | NO  | 94,5%                           |
| 4  | M4C1-3.3   | I98B20000230001 | IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - II° LOTTO                        | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | SI   | SI  | 18,0%                           |
| 5  | M5C2-2.2   | I31B22000900001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15   | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | SI  | 2,1%                            |
| 5  | M5C2-2.2   | I31B22000910001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7  | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | SI  | 2,1%                            |
| 5  | M5C2-2.2   | I41B22000550001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5  | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | SI  | 1,9%                            |
| 5  | M5C2-2.2   | I41B22000560001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 2  | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | NO  | 2,1%                            |
| 5  | M5C2-2.2   | I91B22000690001 | PUI 14 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12   | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | SI  | 1,3%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I18E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - MARCALLO CON CASONE - ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,3%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I18E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - ROSATE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 10,2%                           |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|---|--|--|---|---------------------------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I18E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - ROSATE - ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA                            | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,8%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I18E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - ROSATE - ALLEGGERIMENTO VIA DUSE  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,7%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000010001 | PUI 13 - SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,8%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI                     | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 12,4%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA                        | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,5%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI                           | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,3%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI COLOGNO MONZESE    | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI COLOGNO MONZESE    | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 6,7%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA                     | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 7,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA                   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,3%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI                | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI                    | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,0%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I28E22000110001 | PUI 13 - SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO CENTRALE COLOGNO MONZESE | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 6,8%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - ARLUNO - ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI                               | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 11,3%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - CANEGRATE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO                                  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 10,6%                           |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|---|--|--|---|---------------------------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - CANEGRATE - DISCONNESSIONE VIA BORMIO                                 | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 4,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE                        | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,0%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNECT  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI                                | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 14,4%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - Disconnessione Via Rossini                                  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,6%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA                                | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 7,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA PODGORA                                  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I38E22000110001 | PUI 13 - SPUGNA - TURBIGO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI                     | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,7%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,9%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18              | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18    | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 4,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - ALLEGGERIMENTO VIA 1 MAGGIO                                  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 12,8%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO        | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI                                 | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,7%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA EDISON                                     | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,8%                            |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|---|--|--|---|---------------------------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - BUSCATE - DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 10,8%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 13,2%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000110001 | PUI 13 - SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO)  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 6,9%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000120001 | PUI 13 - SPUGNA - CESANO BOSCONI - DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA' PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO                  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000130001 | PUI 13 - SPUGNA - CESANO BOSCONI - DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000140001 | PUI 13 - SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,0%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000150001 | PUI 13 - SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA)  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000160002 | PUI 13 - SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000170001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000180001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,6%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000200001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTEGRAPPA   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 13,2%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000210001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI - CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,6%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000230001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 12,5%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000240001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 6,6%                            |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|--|--|--|---|---------------------------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000250001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA PASOLINI               | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000270001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI            | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,3%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000280001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA ZARA                                  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000290001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA                            | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 6,6%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000300001 | PUI 13 - SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI        | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000310001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA - BERSAGLIO          | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,0%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000320001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA                             | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,8%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000330001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA NENNI                                 | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000340001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA. CARDINAL FERRARI - CONCILIAZIONE     | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 11,0%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000350001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA                                 | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,8%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I48E22000360001 | PUI 13 - SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO                             | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 6,7%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I58E22000010001 | PUI 13 - SPUGNA - CORSICO - ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 7,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I58E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN VITTORE OLONA - ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO             | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,9%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I68E22000010001 | PUI 13 - SPUGNA - CESATE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE                   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I68E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - PADERNO DUGNANO - ALLEGGERIMENTO VIA SERRA-PADERNO DUGNANO     | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,1%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I68E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - TREZZANO SUL NAVIGLIO - ALLEGGERIMENTO VIA PRATI               | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,4%                            |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|---|--|--|---|---------------------------------|
| 6  | M5C2-2.2C  | I68E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - TREZZANO SUL NAVIGLIO - DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA - VIA GIOIA                                    | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,6%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - BRESCO - DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 12,8%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - BRESCO ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 10,0%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - CINISELLO BALSAMO RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO                                | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,5%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - CORMANO - ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI - DEI BRAVI  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 10,5%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - CORMANO - ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,5%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - MELEGNANO - DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,7%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - Disconnessione Piazzale della Costituzione (area mercato di via Aldo Moro) | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 10,5%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I78E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - ALLEGGERIMENTO VIA STURZO  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 4,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000020001 | PUI 13 - SPUGNA - CORNAREDO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,6%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA                                | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000040001 | PUI 13 - SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate                                   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 10,4%                           |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000050001 | PUI 13 - SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 6,8%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000060001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 11,2%                           |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO  | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|---|--|--|---|---------------------------------|
|    |            |                 | GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE  |  |  |   |                                 |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000070001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - DISCONNESSIONE VIA STAFFORA                         | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,0%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000080001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO                       | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 9,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000090001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI                          | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000100001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA VIA LOMBARDI              | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 7,5%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000110001 | PUI 13 - SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO                      | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000140001 | PUI 13 - SPUGNA - SOLARO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI          | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,0%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000150001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA GOGOL            | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,2%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000160001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA MONTENERO        | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 2,6%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000170001 | PUI 13 - SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,7%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I88E22000180001 | PUI 13 - SPUGNA - SEDRIANO - RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI                     | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 3,0%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I98E22000000001 | PUI 13 - SPUGNA - BARANZATE - RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA     | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I98E22000010001 | PUI 13 - SPUGNA - BARANZATE - RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN)   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 7,4%                            |
| 6  | M5C2-2.2C  | I98E22000030001 | PUI 13 - SPUGNA - SEGRATE - ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI - VIA BUOZZI         | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 8,2%                            |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamentisu accertato in bilancio |
|----|------------|-----------------|--|--|--|---|-----------------------------------|
| 7  | M5C2-3.1   | B81I21000020005 | PINQUA-Edificio SAP di via Brisa in Comune di Parabiago  | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | B85H21000210005 | PINQUA-Edificio ponte comparto ex Rede in Comune di Parabiago                                  | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA            | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | C41B21000070001 | PINQUA-Realizzazione pista ciclabile in prossimità degli interventi 451 e 452 in Comune di Rho | AGGIUDICAZIONE                         | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | C41I21000020001 | PINQUA-Riqualificazione energetica dell'edificio SAP di via Rosselli n. 4 in Comune di Rho     | AGGIUDICAZIONE                         | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | C41I21000030001 | PINQUA-Riqualificazione energetica dell'edificio SAP di via Rosselli n. 8 in Comune di Rho     | AGGIUDICAZIONE                         | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | C91B21000060005 | PINQUA-Passerella ciclopedonale in Comune di Baranzate   | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | C95D21000020005 | PINQUA-Ampliamento edificio ECOCASE SAP e orti collettivi in Comune di Baranzate               | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | C97H21000140005 | PINQUA-Percorso ciclopedonale via Aquileia in Comune di Baranzate                              | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | C99H21000000005 | PINQUA-Ristrutturazione ed ampliamento edificio ex rurale in Comune di Baranzate               | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | D25B18003230001 | PINQUA-Recupero Villa Citterio in Comune di Cologno Monzese                                    | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | E34C21000000001 | PINQUA-Corte Torre Amigazzi in Comune di Rescaldina  | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA            | NO   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | E38C20000320001 | PINQUA-Casa del Balilla in Comune di Legnano   | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | E38C20000330001 | PINQUA-Edificio via Galvani 3 in Comune di Legnano   | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | E38C20000340001 | PINQUA-Edificio via dei Mille 12 in Comune di Legnano  | STIPULA CONTRATTO                      | SI   | SI  | 99,3%                             |
| 7  | M5C2-3.1   | J41B21000170001 | PINQUA-Passerella ciclopedonale a scavalco della SP28 in Comune di Pieve Emanuele              | AGGIUDICAZIONE                         | NO   | NO  | 99,3%                             |

| N. | INTERVENTO | CUP             | DENOMINAZIONE PROGETTO   | FASE PROCEDURALE (post controllo ente) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (Revisori al 30.06.2023) | CRONOPROGRAMMA RISPETTATO (ReGiS; riscontro ente) | Pagamenti accertati in bilancio |
|----|------------|-----------------|--|--|--|---|---------------------------------|
| 7  | M5C2-3.1   | J41B21000180001 | PINQUA-Collegamenti ciclopedonali con passante ferroviario in Comune di Pieve Emanuele                           | AGGIUDICAZIONE                         | NO   | NO  | 99,3%                           |
| 7  | M5C2-3.1   | J43D21000000001 | PINQUA-Riqualificazione dei percorsi del Parco delle Stelle Alpine in via delle Rose in Comune di Pieve Emanuele | AGGIUDICAZIONE                         | NO   | NO  | 99,3%                           |
| 7  | M5C2-3.1   | J47H21000220001 | PINQUA-Ampliamento Centro di Formazione Professionale e co-working in Comune di Pieve Emanuele                   | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | NO  | 99,3%                           |
| 7  | M5C2-3.1   | J47H21000230001 | PINQUA-Asilo nido Q.re delle Rose in Comune di Pieve Emanuele  | AGGIUDICAZIONE                         | SI   | NO  | 99,3%                           |
| 7  | M5C2-3.1   | J81E21000060005 | PINQUA-Riqualificazione Piazza Cadorna in Comune di Solaro   | STIPULA CONTRATTO                      | NO   | SI  | 99,3%                           |
| 7  | M5C2-3.1   | J81E21000070005 | PINQUA-Percorso ciclopedonale di connessione tra gli interventi 441 e 443 in Comune di Solaro                    | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | NO   | SI  | 99,3%                           |
| 7  | M5C2-3.1   | J81I21000010005 | PINQUA-Edificio housing sociale in Comune di Solaro  | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA            | NO   | SI  | 99,3%                           |
|    |            |                 |  |  | <b>16</b>  | <b>11</b>   | 17,5%                           |

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS

